农村公益事业建设项目（2024-2025年）

绩效评价报告

项目名称：农村公益事业建设项目（2024-2025年）

项目单位：永春县各乡镇

委托单位：永春县财政局

编制机构：鑫永安（厦门）集团有限公司

报告文号：鑫厦绩〔2026〕9号-1

编制日期：2026年9月

农村公益事业建设项目（2024-2025年）

绩效评价报告

编 制 机 构 ：鑫永安（厦门）集团有限公司

评价主要成员：廖彩红（持有会计专业技术资格）

黄雯婷（持有会计专业技术资格）

庄秋娥（持有会计专业技术资格）

徐贵平（持有会计专业技术资格）

齐湘婷（持有会计专业技术资格）

黄建智（绩效助理）

项 目 负 责 人：徐干远（高端绩效评价人才、高级会计师、

集美大学硕士生导师、厦门市会计咨询专家）

目录

一、基本情况 2
（一）项目概况 2
1.项目背景 2
2.项目内容及实施情况 2
3.资金投入和使用情况 3
（二）项目绩效目标 4
二、绩效评价工作开展情况 4
（一）绩效评价目的、对象和范围 4
1.评价目的 4
2.评价对象和范围 4
（二）评价原则与方法 5
（三）评价指标体系 5
（四）绩效评价工作过程 6
三、 评价结论及主要绩效（附相关评分表） 6
（一）评价结论 6
（二）项目所实现的效益 7
四、绩效评价指标分析 8
（一）项目决策情况分析 8
1.立项依据充分性分析 8
2.立项程序规范性分析 9
3.绩效目标设置情况分析 10
4.预算编制科学性分析 11
5.资金分配合理性分析 11
（二）项目过程情况分析 12
1.资金管理情况分析 12
2.项目组织实施情况分析 14
（三）项目产出情况分析 16

1.产出数量分析 16
2.产出质量分析 17
3.产出时效性分析 18
4.产出成本分析 20
（四）项目效益情况分析 20
1.社会效益分析 20
2.产业振兴项目经济效益分析 23
3.可持续影响分析 26
4.满意度分析 27
五、存在的问题 27
（一）效益绩效指标设置精细化不足，目标导向性偏弱 27
（二）个别项目立项论证深度不足，预算编制科学性有待提升 28
（三）专项资金使用管理不够规范，存在核算不规范及非有效支出问题 28
（四）项目过程管理不够严谨，程序时序与招标采购管控存在瑕疵 30
（五）个别项目建设管控不严，存在建设内容偏差及工程质量缺陷 31
（六）项目实施进度管控偏弱，项目未按批复节点完工问题较为普遍 31
（七）少数项目建设功能定位偏离、长效管护存在短板，公共效益发挥不够充分33
（八）产业振兴项目建成后资产收益偏低，辐射带动作用成效有限 34
（九）少数项目备案归档资料要素不全，档案管理存在薄弱环节 36
六、有关建议 36
（一）细化绩效指标设置，强化目标刚性约束 36
（二）做实项目前期论证，提升预算编制科学性 36
（三）规范财务核算管理，严格把控资金有效支出 37
（四）健全项目管控体系，规范招标采购及项目名称全流程管理 37
（五）强化施工现场管控，严控建设偏差与工程质量 38
（六）压实进度管控责任，建立项目动态推进机制 39
（七）精准匹配项目功能，完善长效运维管护机制 39
（八）盘活产业项目资产，提升增收赋能辐射实效 40

（九）规范项目档案管理，压实村级归档履职责任 40
七、其他说明 41
八、附件 42
附件1 农村公益事业建设项目（2024-2025年）绩效评价指标体系 43
附件2 评价工作流程 58
附件3 现场抽查项目清单 59
附件4 项目建设情况及收益情况 61
附件5 村民问卷调查 62
附件6 乡镇、村工作人员问卷调查 65
附件7 2024年-2025年农村公益事业建设项目资金使用情况 68
附件8 不予认定支出明细 74
附件9 2024年-2025年农村公益事业建设项目收支及实施情况（按乡镇统计）76

前言

为全面了解永春县各乡镇2024-2025年农村公益事业建设项目的实施情况和实施效果，根据《中华人民共和国预算法》《福建省财政厅关于印发〈福建省财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（闽财绩〔2015〕4号）、《泉州市财政局关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（泉财绩〔2020〕163号）、《关于印发〈福建省农村公益事业财政奖补项目建设资金管理实施办法〉〈福建省农村公益事业财政奖补项目管理实施办法〉〈福建省农村公益事业财政奖补项目绩效评价实施办法〉的通知》（闽财农〔2020〕6号）等有关文件精神，永春县财政局（以下简称“县财政局”）委托鑫永安（厦门）集团有限公司（以下简称“我司”）对永春县各乡镇2024-2025年农村公益事业建设项目（以下简称“本项目”）实施绩效评价。我司严格按照绩效评价工作规范，通过资料审核、数据采集、实地调研、座谈访谈、综合研判等工作程序，并结合主管单位绩效自评结果，对项目实施、资金使用及效益达成情况开展系统分析，形成本绩效评价报告。

正文

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

随着乡村振兴持续推进，村民对生产生活配套的需求不断提升。部分村庄原有基础设施建设标准偏低，部分道路通行条件有限、照明设施老化、公共停车与休闲活动场地不足，沟渠排水、防灾避险等设施保障能力仍有提升空间，现有配套与群众日益增长的生活需求还存在一定差距。

为补齐村级公益事业发展短板，依据村级公益事业建设一事一议财政奖补相关政策，各村经村民议事、项目申报立项，统筹财政奖补、村集体自筹资金，组织实施道路硬化、路灯亮化、停车场、休闲场所、环境整治等公益项目，完善乡村基础设施，持续改善村庄人居环境，方便群众生产生活，夯实乡村振兴基础。

2.项目内容及实施情况

本项目以各乡镇、村集体为实施主体，统筹开展村级公益事业及产业振兴配套建设，项目覆盖全县 22 个乡镇、174 个村，共计实施 294 个子项目，包含一事一议项目 275 个、6 个产业振兴示范村拆解落地 19 个独立子项目。按照建设功能与属性划分，基础设施服务保障类项目 237 个，公共活动供给类项目 36 个，产业振兴及县级配套项目 8 个，项目建设立足各村实际发展需求，分批申报、分步推进，补齐乡村发展短板。

基础设施服务保障类项目为本项目投入重点，主要实施村组路面硬化、村内路灯安装、村落沟渠修复清淤、排洪排水整治、边坡隐患治理、生态

公共停车场新建及改造等民生工程。公共活动供给类项目主要建设休闲步道、沿溪步道、村级文化书屋、乡村健身公园、文化广场、避灾安置点等设施。产业振兴及县级配套项目主要实施农产品仓储展示中心装修升级、光伏发电设备采购安装、停车区充电桩配套、乡村花园综合提升、产业道路拓宽改造等工程。

本项目整体实施周期跨度较长，各村、各类型项目推进节奏不一。建设期间对部分客观条件受限、原建设方案无法落地的项目，依规完成7个项目的名称及建设内容变更调整。全部294个子项目中，已完工281个、在建6个、未实施7个，累计完成竣工验收项目263个，其中2个已验收项目处于闲置状态，村集体正通过乡镇农村（社区）集体小规模建设招投标中心开展资产招租邀请招标。细分项目类型来看，275个一事一议项目完工267个、在建4个、未实施4个，19个产业振兴子项目完工13个、在建2个、未实施4个。

3.资金投入和使用情况

本项目财政预算总资金4,906.25万元，资金已全部足额到位，到位率100%。其中：产业振兴项目资金1,100.00万元、一事一议项目资金3,806.25万元；资金来源包含省级财政资金3,865.00万元、县级财政资金1,041.25万元。

截至2026年6月，受部分项目实施进度偏慢影响，财政收回指标暂缓下达资金642.00万元，实际下达到各村居的财政补助资金为4,264.25万元。村居收到上述补助资金后，实际使用财政补助资金3,755.40万元（不含其他来源资金支付金额），财政补助资金结余508.85万元，整体预算执行率88.07%。

（二）项目绩效目标

依托村级公益事业建设一事一议财政奖补政策，通过实施村内道路硬化、路灯亮化、停车场、休闲活动场所、环境整治、防灾避险设施等村级公益项目，补齐农村基础设施配套短板，持续改善农村人居环境，提升群众生产生活便利度，夯实乡村振兴发展基础。项目严格落实村民民主议事程序，规范项目实施与资金管理，建成设施实现长效管护，充分发挥村级公益项目社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

为全面、客观、公正评价永春县 22 个乡镇 2024-2025 年农村公益事业及产业振兴建设项目财政资金使用绩效，核查项目决策程序合规性、资金管理规范性、项目实施有效性及产出效益实现情况，全面梳理项目建设、资金使用、运营管护全过程的情况。总结项目建设管理经验，发现资金使用、项目推进及绩效管理中存在的薄弱环节，结合项目实际提出针对性改进建议，进一步提升财政专项资金使用效益和项目管理水平，为后续同类乡村基础设施、产业配套项目的资金安排、绩效目标设置及预算管控工作提供参考依据。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2024-2025 年永春县 22 个乡镇、174 个村实施的 294 个村级建设子项目，项目财政预算资金合计 4,906.25 万元，项目类型

主要包含一事一议村级公益事业财政奖补项目、产业振兴示范村建设项目两大类。本次评价围绕项目整体实施全过程开展，重点核查项目建设产出成果、财政资金使用合规性、预算执行落实情况以及项目落地实施综合成效，核实项目整体绩效完成水平。

（二）评价原则与方法

本次绩效评价严格遵循客观公正、科学规范、全面系统、注重实效的工作原则。评价过程中，通过梳理查阅县财政局、各乡镇报送的项目实施方案、管理制度、财务凭证、过程台账等佐证资料，全面掌握项目实施运行流程与专项资金收支使用情况。本次评价综合采用指标评分法、对比分析法、现场核查法、受众调查法等多元评价方式，对照既定绩效指标体系，核查各专项绩效目标完成情况、项目实施管理规范性及财政资金使用效益，客观研判项目整体落地成效。

本次评价采取分层抽样方式开展现场核查，共计抽取9个乡镇（占全县22个乡镇的40.91%）、20个村（占补助总村数的11.49%）、58个子项目开展核查，核查项目涉及的财政补助资金为1,913.50万元，占项目总预算的39.00%。其中对6个产业振兴示范村拆解的19个子项目实现全覆盖，同步抽查39个一事一议项目（抽查清单详见附件3），抽样范围具有代表性，能够客观反映本批次项目整体实施绩效情况。

（三）评价指标体系

本次绩效评价指标体系共设置项目决策、过程管理、项目产出、项目效益4项一级指标，下设13项二级指标、25项三级指标，全面覆盖项目立项决策、实施过程、产出成果及社会效益等关键维度。各指标具体构成、

评分标准、分值设置及最终得分情况详见附件1。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作严格按照财政绩效评价规范流程开展，整体分为前期准备、组织实施、结果汇总、归档收尾四个阶段，有序完成方案制定、资料收集、实地核查、数据分析、综合研判、报告撰写及资料归档等全流程工作。具体工作流程详见附件2。

三、评价结论及主要绩效（附相关评分表）

（一）评价结论

本项目绩效评价得分为80.26分，综合评价等级为“良”（指标得分表详见表1）。评价结论为：

从项目决策来看，本项目立项依据充分、立项流程基本符合一事一议及产业振兴项目管理相关规定，契合乡村振兴、村级公益事业建设政策导向；但少数项目前期论证不够充分，部分项目绩效目标与项目建设任务匹配度不足。**从项目过程来看，**财务、业务管理制度体系较为健全，资金拨付总体按制度执行；但项目实施进度管控有效性不足，部分项目延期、滞后甚至未实施。资金使用管理存在短板，本次核查发现存在部分非有效支出，同时部分村居账务归集不细化，无法精准拆分单个项目对应支出；项目招标采购时序管控、资料复核、档案归集也存在疏漏。**从项目产出来看，**本批次大部分项目按期完成工程建设并交付使用，项目建设产出总体达到立项预期；但项目实施进度管控有效性不足，部分项目未按批复时限完工，存在项目延期、推进滞后甚至未实施的情况。**从项目效益来看，**本项目能

够有效补齐村级基础设施短板，改善人居环境、完善村内公益配套，对方便群众生产生活具备积极作用；部分项目建成后管护不足、长期闲置或实际用途偏离立项目标，项目预期公益效益未能充分释放，产业类项目资产投入产出匹配度不高，产业带动增收效果有限。具体指标得分情况详见表1。

表1 项目绩效评价情况得分

评价维度	分值	评价得分	评价分值占比（%）
决策	17.00	13.50	79.41%
过程	20.00	16.64	83.21%
产出	26.00	20.50	78.85%
效益	37.00	29.62	80.05%
合计	100.00	80.26	80.26%
绩效评定级别	良		

注：各指标的详细得分及评分依据情况详见附件1。

（二）项目所实现的效益

基础设施服务保障能力方面：本项目聚焦村级道路、亮化设施、人居环境、公共场地等基础民生短板实施改造建设，进一步完善了村级基础设施配套体系，有效改善了村庄通行条件、夜间照明环境及整体村容村貌，乡村基础服务保障基础得到夯实。

公共活动供给改善方面：本项目通过实施村级文化场地、休闲公园、公共活动场地提质改造，有效补充了村级公共服务硬件配套，拓展了村民文体休闲活动空间，进一步健全了村级公共服务供给体系。

群众需求匹配及普惠覆盖方面：本项目围绕村民出行通行、人居环境整治、休闲配套完善等基层民生重点需求布局实施，项目普惠覆盖范围广、

受益群体基数大。整体建设内容贴合本村群众实际诉求，群众认可度较高，民生普惠落地成效良好。

村集体经济增收效益方面：本项目通过产业场地修缮、设施配套改造形成村级经营性资产，部分成熟运营项目通过对外租赁方式实现稳定租金收入，有效拓宽了村集体经营性增收渠道。现阶段整体增收成效初步显现，产业造血赋能潜力有待进一步释放。

产业辐射带动效益方面：本项目部分落地运营的产业项目，有效盘活了乡村闲置场地及本土资源，初步形成了村级产业发展支撑。整体产业辐射带动、民生就业助推成效较为有限，中长期产业赋能价值可进一步挖掘提升。

项目可持续影响方面：本项目各子项目建成后均明确村级管护主体，初步建立常态化长效管护机制，绝大多数公益类设施可正常投入使用，能够持续为村民提供通行、照明、休闲等基础便民服务，项目具备持续发挥民生服务效益的基础条件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.立项依据充分性分析

本项目涵盖全县村级公益事业一事一议财政奖补项目及乡村产业振兴配套项目，项目实施立足县域农村基础设施短板与乡村产业发展需求，整体立项导向清晰、依据充分。从政策合规性来看，项目建设聚焦村内户外公益设施完善、人居环境提升、乡村特色产业培育等重点领域，契合国家乡村振兴战略部署及福建省农村综合改革、一事一议财政奖补制度的政策

导向与行业建设规划，项目建设方向符合现行法律法规及专项管理要求。从部门履职与财政事权维度分析，组织开展村级公益事业奖补、扶持乡村产业发展，是县财政局履行农村综合改革转移支付资金监管、统筹保障乡村建设投入的法定职责，同时也是乡镇人民政府统筹辖区村级公共服务、补齐乡村民生短板、推动属地产业发展的重点工作内容，履职边界清晰、权责匹配。从财政投入属性来看，一事一议项目均为村级公益性、普惠性民生建设内容，属于公共财政保障乡村基层公益事业的重点支持领域，财政资金投入方向契合各级财政事权与支出责任划分原则。从项目单位提供的现有资料来看，未发现与相关部门同类项目及部门内部相关项目重复建设。

由此可见，本项目立项依据充分。

2.立项程序规范性分析

根据农村公益事业一事一议财政奖补项目管理相关规定，各乡镇按县财政局要求建立一事一议项目库。村级户外公益性建设项目通过村“两委”或受益群众提议，经村民大会或村民代表会议民主议事、集体决策后形成项目申报需求。乡镇对村级申报项目的真实性、可行性、合规性开展现场审核，审核通过并经乡镇主要领导签字确认后，统一汇总上报至县财政局。

产业振兴配套及示范村项目，按照省级年度奖补指标及工作安排，由乡镇申报、县财政局审核择优入库。本次核查对项目设立程序、审批资料完整性、前期论证及集体决策情况进行核验，整体项目立项基本按照既定申报审批流程推进，多数项目履行了村级集体决策、乡镇初审、县级审核的立项程序。但个别项目前期规划论证、现场踏勘、风险研判不够全面充分，对项目实施存在的设计缺陷、施工条件、土地报批、用地性质、材料

供应及气候影响等制约因素预判不足，导致部分项目审批立项后未能按期落地实施。其中，**达埔镇汉口村** 215 线沿线路灯项目因前期设计存在缺陷，首次开标后无法施工，需重新优化设计并二次开标，叠加灯具定制周期长、材料进场不齐全及多雨天气影响，项目实施进度滞后；**一都镇美岭村**莲花山农村休闲观光旅游项目受土地报批周期较长影响，项目开标时间延后；**东关镇东华社区**边坡治理工程虽已完成招标，但施工方因时序安排问题未及时进场开工；**达埔镇岩峰村**项目因涉及土地征用事宜未能及时推进；**玉斗镇白珩村** 2025 年产业振兴示范村仓储中心项目因土地性质变更暂未获批，项目无法推进；**桃城镇洋上村** 2024 年产业振兴示范村农产品展销中心项目，因土地审批办理流程繁杂、手续尚未办结，项目前期工作停滞、暂未落地。

整体来看，本项目立项程序虽基本合规，但前期可行性研判、实施风险评估、落地条件论证精细化程度不足，项目前置论证工作仍需完善。

3.绩效目标设置情况分析

本项目设置了“支持农村公益设施建设数量≥251 个”“支持产业振兴示范村数量 6 个”“农村公益事业建设工程验收合格率 100%”“项目区农民满意度≥90%”“项目区基层干部满意度≥90%”“项目村基层党组织凝聚力战斗力有所增强”“农村生态环境有效改善”等绩效指标。绩效目标与一事一议财政奖补、产业振兴示范村建设的项目工作内容相关，目标设定结合项目资金规模统筹考量，整体具备可操作性，并已将总体绩效目标分解为对应建设任务，设置项目数量、工程合格率、群众满意度等指标，指标内容与项目计划任务相对应。但绩效目标设置存在不足：部分效益类目标表述较为宏观，未结合本批次项目建设内容明确预期成效；同时部分

指标精细化不足，如“项目村基层党组织凝聚力战斗力有所增强”“农村生态环境有效改善”仅为定性描述，未明确评判口径与衡量标准，无法依托客观数据核验目标完成情况，效益类指标多采用定性描述，缺少可量化的效益指标支撑。

4.预算编制科学性分析

本项目一事一议财政奖补及产业振兴配套项目预算编制基本结合项目建设内容开展资金测算，预算内容与项目建设任务总体匹配，资金投入规模与项目工作量基本对应，预算编制履行村级申报、乡镇初审、县级审核的逐级审核流程。但经核查，个别项目前期立项论证与实施条件研判不够严谨，预算编制阶段未充分核查用地审批、土地属性、征地条件等关键前置要素，对项目落地可行性判断不足。如**桃城镇洋上村**2024年产业振兴示范村农产品展销中心子项目，立项后土地审批手续迟迟未能办结；**玉斗镇白珩村**2025年产业振兴示范村仓储中心子项目，前期未核实土地性质限制，项目立项后用地手续无法获批，项目停滞；**达埔镇岩峰村**八九组角落排洪排水及道路硬化项目，前期未充分研判土地征用难度，项目未能按期落地。

上述情况反映部分项目预算编制前期调研论证深度不足，预算编制科学性有待进一步提升。

5.资金分配合理性分析

本项目资金分配严格参照《福建省农村综合改革转移支付资金管理办法》（闽财〔2024〕33号）相关制度规定执行，采用因素法开展资金测算分配，综合结合年度预算执行成效、资金使用规范度、日常监管落实情况等核心指标统筹分配资金，并结合永春县实际财力情况进行适度调节。其中，一事一议项目选定村民民主议事程序议定的村内户外公益事业建设范

畴，重点支持村容村貌提升、人居环境整治、村内道路修缮、农田水利配套、公共活动场所完善等基础性民生工程；乡村产业振兴示范村项目严格按照省级年度申报通知及申报标准规范流程申报，由县级财政牵头组织申报初审，市级财政筛选择优向上推荐，最终经省厅审核确认后下达定额专项补助资金。本次项目资金实行总量统筹管控模式，同步设置10.00万元最低补助保底机制，资金下达规模基本适配各村公益事业及产业振兴建设实际需求。

（二）项目过程情况分析

1.资金管理情况分析

（1）资金到位情况分析

本次项目预算资金4,906.25万元，根据《永春县财政局关于2024年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目的批复》（永财农〔2024〕5号）、《永春县财政局关于2024年第二批村级公益事业建设财政奖补建设项目的批复》（永财农〔2024〕9号）等多份文件及财政局支出明细账显示，本项目下达资金4,906.25万元，与预算资金匹配，资金到位率100%。

（2）预算执行率分析

根据县财政局、各乡镇、村居提供的收支台账、明细账统计，本项目下达资金4,906.25万元，受部分项目实施进度偏慢影响，财政收回指标暂缓下达资金642.00万元，实际下达到各村居的财政补助资金为4,264.25万元。剔除不符合规定支出的前期费用、支付内容与项目不符、项目进度滞后未及时支付等原因后，实际使用财政补助资金3,755.40万元（不含其他来源资金支付金额），补助资金剩余金额508.85万元，预算执行率88.07%，

具体情况详见附件7。

由此可见，本项目整体资金支出推进情况良好，大部分项目能够按照项目实施进度支付。

（3）资金使用合规性分析

本次核查依据各乡镇、村居提供的收支台账、明细账开展资金合规性核验。项目资金拨付审批手续总体基本完整，资金使用方向基本符合项目预算批复及合同约定用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等重大问题，但抽样核查过程中，发现部分项目在会计核算、资金匹配使用方面存在不足。

在会计核算方面：部分村居一事一议项目会计科目核算不规范，未设置一事一议专项科目核算。例如**下洋镇下洋村**亮化工程三期一事一议资金，收入会计科目为“补助收入-其他”；**下洋镇上姚村**领头格栈道工程一事一议资金，会计科目为“补助收入-其他”；**下洋镇长汀村**路灯亮化工程一事一议资金，会计科目为“专项应付款-其他、补助收入-其他”；**锦斗镇云路村**角落路路灯修复一事一议资金，收入会计科目为“专项应付款-农村公益建设”；**达埔镇乌石村**村部周边路灯亮化工程一事一议资金，收入会计科目为“专项应付款-其他”等。

在资金使用方面：本次核减非有效支出金额97.52万元，例如：**达埔镇新溪村**Y85洑岱线晋级工程，与县财政局指标文件下达的村道硬化项目名称不一致。Y85洑岱线晋级工程中标金额214.49万元，永春县民政局、县财政局2024年扶持老区建设县级补助资金30.00万元，永春县交通运输局分别转拨2024年第二批、2025年度第一批交通项目市级补助资金8.00万元、33.90万元。从县交通局下达的文件来看，该路段路线编码为Y085350525，属于乡道，与财政指标文件标注的村道属性不一致，该笔支

出不予认定为本项目有效支出。**锦斗镇卓湖村**大坪格至300米入口新建道路工程项目，备案表中该项目预算总额60.00万元，建设内容为村内道路其他路面1.20千米，备案开工日期2024年6月28日；资金支出凭证对应的项目名称为永春县锦斗镇卓湖村X315线至大坪格公路入口路基建设工程，建设内容为路基300米，开工日期2023年9月4日，完工日期2023年11月29日，实际支出内容与文件补助项目不一致，因此2024年支出20.00万元、2025年支出14.00万元，均不予认定为本项目有效支出。此外，部分项目发生的前期费用、设计费、结算审核费等二类费用，按规定不予认定为本次奖补资金有效支出，具体详见附件8。

2.项目组织实施情况分析

（1）管理制度健全性分析

本项目已建立省、市、县三级配套的财务与业务管理制度体系。省级层面出台《福建省农村公益事业财政奖补项目建设资金管理实施办法》《福建省农村公益事业财政奖补项目管理实施办法》《福建省农村公益事业财政奖补项目绩效评价实施办法》（闽财农〔2020〕6号），泉州市配套《泉州市市级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理规定》（泉财规〔2022〕1号），对项目申报、实施流程、资金使用、进度管控、绩效评价等作出统一规范。永春县印发《永春县加强村级公益事业一事一议项目管理补充规定》（永政办〔2017〕121号），对奖补与管理原则、项目筛选申报、项目实施与验收、资金管理与使用、项目监督与考核均作出细化规定，将上级政策落地到本县一事一议项目实操环节。上述制度文件合法合规，覆盖项目全流程业务管理与资金财务管理要求，制度体系完整健全，满足项目管理需要。

（2）制度执行有效性情况分析

经查阅项目档案，本次抽样核查项目总体能够遵守农村公益事业一事一议财政奖补相关法律法规及省、市、县项目管理规定，项目实施、资金拨付基本按制度要求执行。针对已批复但无法实施的项目，由乡镇申报项目调整申请，县级财政组织审核后行文批复，履行项目调整报批流程。依据《永春县财政局关于2024年永春县村级公益事业建设一事一议财政奖补建设项目调整的批复》，完成4个项目的调整工作；依据《永春县财政局关于2025年第二批农村公益事业建设财政奖补建设项目的批复》（永财农〔2025〕22号），对已批复无法实施的3个项目予以调整，按规定履行变更报批程序。大部分项目合同书、验收报告等资料收集归档，项目实施人员、场地等实施条件基本落实到位。但极少数项目备案归档资料存在要素缺失问题，例如**湖洋镇玉柱村**老人活动中心修缮提升工程，项目备案表未设置建设内容填报栏目，备案材料仅登记项目名称，缺少项目建设内容、建设规模等关键备案信息，备案资料要素不全，项目资料归档管理仍有提升空间。

（3）一事一议及产业振兴项目实施组织合规性分析

现场核查显示，本项目大部分一事一议及产业振兴项目能够严格落实村民议事、民主决策、立项公示等规定要求，项目申报流程公开透明，采购招标整体程序合规有序，能够按照财政项目管理规定规范开展项目储备、申报及实施工作，项目程序性管理整体较为规范。但核查同时发现少量项目在立项申报、名称统筹、招标管控及资料时序管理方面仍存在瑕疵。例如：**石鼓镇卿园村**卿园寨亮化工程项目招标环节，福建泉州市君慕建设有限公司、福建泉州市跨越集采供应链管理有限公司、福建泉州市坤筑发展

有限公司三家单位参与招标文件响应，坤筑发展为本项目中标单位。三家企业股权层面相互独立，但存在潜在关联线索，君慕建设与跨越集采留存相同联系电话 139****2168（报告中对号码加密），坤筑发展 2022 年 8 月工商变更后联络员变更为康巧华，康巧华同时为君慕建设法定代表人及 100%持股股东，投标单位存在潜在关联风险；**达埔镇金星村** 2025 年一事一议财政奖补申请表项目名称为金星村天磨线公路驿站工程，与财政指标下达文件“金星村天磨线排洪防滑坡”项目名称不一致；**桃城镇洋上村**新坂堂右侧民居修缮工程项目招标公告发布时间为 2024 年 4 月 23 日，补充公告发布时间为 2024 年 4 月 26 日（变更项目名称），但 2024 年 4 月 23 日的招标活动日程及招标代理机构编制的招标文件均已使用变更后的项目名称，2024 年 4 月 24 日收到的投标确认函亦按新名称填写，项目招标变更流程时序不规范、程序闭环管理不到位。**达埔镇蓬莱村**路灯类项目，先后以“太阳能路灯改造”“路灯改造”“达埔镇蓬莱村太阳能路灯建设项目”不同项目名称分年度申报一事一议财政奖补资金，各次申报项目工程预算总额不一致。本次实施项目中标金额 41.30 万元，财政核定补助金额 42.50 万元，结算审核金额 43.81 万元，且本次项目财政核定补助金额、结算审核金额均高于中标金额，项目立项测算及申报管控严谨性不足。

整体来看，项目总体程序执行较为规范，个别项目存在立项名称管理、招标询价管控及申报口径方面的瑕疵，项目管理规范性有待提升。

（三）项目产出情况分析

1.产出数量分析

本项目计划支持农村公益设施建设项目不少于 251 个、产业振兴县级配套资金项目 4 个、产业振兴示范村 6 个。本项目分为一事一议项目、产

业振兴子项目两类，其中一事一议项目275个，6个产业振兴示范村项目拆解为19个独立子项目，合计纳入评价子项目294个。各子项目按照自身实施状态，单独判定完工、在建、未实施，避免因同一大项目下部分子项目滞后，直接判定整体项目未完工，客观反映项目实施真实情况。294个子项目中，完工281个、在建6个、未实施7个，项目建设完成率95.58%。本项目绝大部分子项目已完成建设并交付使用；少量项目处于在建阶段，个别项目尚未启动实施，项目整体完工交付水平较高。具体情况详见附件4。

2.产出质量分析

（1）工程建设质量达标情况

本次现场抽查58个项目，大部分工程未发现肉眼可见的明显质量缺陷，未发生工程质量事故，不存在主管部门认定的重大质量隐患。其中石鼓镇卿园村寨卿线路基塌方修复工程（补助资金50.00万元）于2026年3月25日完成竣工验收。绩效评价组2026年9月9日现场核查时，该项目路面存在长条裂缝，存在肉眼可见质量缺陷。

（2）设施配置完备性分析

本次核查总体情况良好，绝大多数项目能够严格按照项目批复实施方案、施工图纸及建设规范组织实施，项目建设内容、设施配置标准、建设规模均与立项设计要求保持一致，建成设施功能完整、配套齐全，能够有效匹配项目建设定位与公益服务目标，项目落地实施规范性整体较好。但个别项目建成配套设施与设计文件存在偏差，例如：**呈祥乡呈祥村**百姓大舞台项目设计图纸及竣工图载明窗帘工程量146.30㎡，经现场实测及结算审核工程量仅约80㎡，项目未按规定履行工程变更手续，存在未按设计内

容实施的情形，竣工图编制内容与现场实际建设状况不符。**东平镇霞林村**老人健身功能室项目中标价204,529.00元，结算价141,691.00元，较中标价降幅30.72%，核减金额67,341.50元，项目实施阶段对工程内容进行大幅甩项，实际建设内容与立项方案存在一定差异。

总体而言，项目设施配置整体完备度较高，个别项目存在建设内容与图纸不一致情况。

3.产出时效性分析

项目实施进度管控有效性分析：产业振兴项目由多个子项目组成，实施周期跨度较大，各子项目推进节奏存在明显差异。例如：**桃城镇洋上村**2024年产业振兴示范村项目下设洋上村农产品展销中心、现代产业农产品仓储及展示中心装修工程两个子项目，项目整体推进滞后，其中洋上村农产品展销中心受土地审批手续尚未办结影响，前期工作停滞，暂未落地实施，土地审批环节多、办理周期较长。**一都镇美岭村**2024年产业振兴示范村各子项目建设进度不均衡，莲花山农村休闲观光旅游项目直至2026年8月才启动招标，建设时序滞后。**呈祥乡呈祥村**2025年产业振兴示范村包含云山花园提升改造项目、云山花园提升改造（道路拓宽）工程，截至2026年9月，道路拓宽工程处于在建状态，云山花园提升改造项目尚未实施，处于招投标阶段，整体推进缓慢。**玉斗镇白珩村**2025年产业振兴示范村包含白珩村公路停车区充电桩项目（二期）、218.72千瓦光伏发电采购项目、仓储中心（暂定名）三个子项目，各子项目推进进度不一，仓储中心项目因土地性质变更暂未获批，无法继续推进；光伏发电采购项目已基本完工，尚未组织竣工验收。

一事一议项目中也存在部分项目推进缓慢、未开工或暂未实施情况。

例如：**东关镇东华社区**边坡治理工程已完成招标，受施工方时间安排因素影响尚未进场开工；**湖洋镇桃美村**济美小区道路硬化建设工程暂未实施；**达埔镇岩峰村**八九组角落排洪、排水及道路硬化项目因涉及土地征用，计划2026年9月中旬开工、12月完工。

对照财政部门各批次项目批复文件的工期要求，多批次项目存在未按批复节点完工的情况。依据《永春县财政局关于2024年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目的批复》（永财农〔2024〕5号），要求项目5月中旬全部动工，6月底完成全部工程任务，该批次批复84个项目，65个项目实际完工时间为2024年7月至2025年8月，未按期完工。依据《永春县财政局关于2024年第二批村级公益事业建设财政奖补建设项目的批复》（永财农〔2024〕9号），要求11月底完成全部工程任务，该批次批复17个项目，全部项目实际完工时间落在2024年12月截至2025年12月，均未按批复节点完工。依据《永春县财政局关于2024年第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目的批复》（永财农〔2024〕16号），要求项目11月中旬全部动工，3个月内完成全部工程任务，该批次批复36个项目，8个项目完工时间落在2025年3月至2025年11月，未按期完工。依据《永春县财政局关于2024年第四批农村公益事业建设财政奖补建设项目的批复》（永财农〔2025〕1号），要求3个月内完成全部工程任务，该批次批复5个项目，4个项目完工时间落在2025年7月截至2025年12月，未按期完工。综合统计，142个项目中有94个项目未按批复时限完工，延期项目占比66.20%，项目延期现象较为普遍。

结合项目调研问卷反馈，项目实施阶段主要制约因素包含村集体自筹资金筹措压力较大、群众诉求协调沟通难度高、雨季天气、征地占地等客观条件限制，同时项目实施过程中的进度管控力度不足，未能及时预判、

化解各类阻滞因素，项目实施进度管控成效有待提升。

4.产出成本分析

本次评价采取抽样方式，查阅抽样项目的合同、工程量验收资料、结算确认文件、资金支付凭证等材料，核查项目实际支付款项是否超出已确认计价依据总额。经对样本项目逐一核实，抽样范围内项目实际支付金额均未突破对应的计价依据上限，未发现超计价依据支付、无依据多付资金等问题，项目成本支付管控总体合规。

（四）项目效益情况分析

1.社会效益分析

（1）基础设施服务保障能力分析

本项目涵盖村内道路、亮化设施、人居环境整治、场地改造等村级基础民生工程，通过实施上述项目，进一步完善了村级基础设施配套，对提升村庄通行保障、夜间照明及人居环境品质起到了积极作用，夯实了乡村基础服务保障水平。

根据镇村**工作人员问卷调查**（有效样本248份），87.9%的受访者认为项目改善了村民出行通行条件，74.6%的受访者认为改善了村庄夜间通行照明条件，65.32%的受访者认为改善了村庄人居环境面貌，仅7.26%的受访者认为项目带来的实际改善有限，如图1所示。**村民问卷调查**（有效样本181份）显示，83.98%的受访村民反映通行道路条件得到改善，86.74%的村民认为夜间出行有照明、出行更安全，仅4.42%的村民未感受到明显便利，如图2所示。但从现场抽样核查情况来看，**湖洋镇玉柱村**自然灾害避灾点改造提升项目配套购置岩板大圆桌及实木餐椅，家具配置标准偏高，

与避灾点作为灾害临时安置场所的应急保障定位、物资使用需求匹配度不足，设施选型未充分结合应急场所实用简约的建设要求。

整体来看，项目基础设施服务保障的整体成效总体向好。但部分项目存在后期管护不到位、设施运维薄弱、项目实施进度滞后、个别项目未按期实施以及少量项目建成后变更用途转为办公使用等问题，未能完全按照立项初衷发挥公益服务效能，制约了项目效益的充分发挥。

图 1 项目实施产生的正向作用问卷调查（村工作人员）

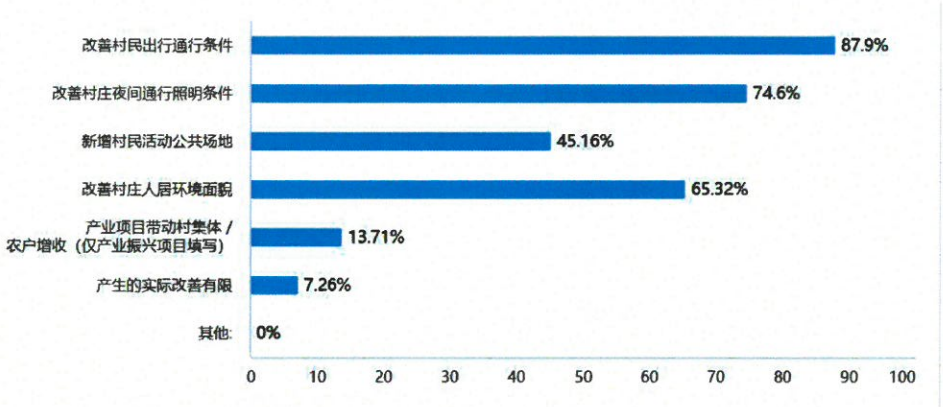

图 2 给日常生活带来的实际便利问卷调查（村民问卷）

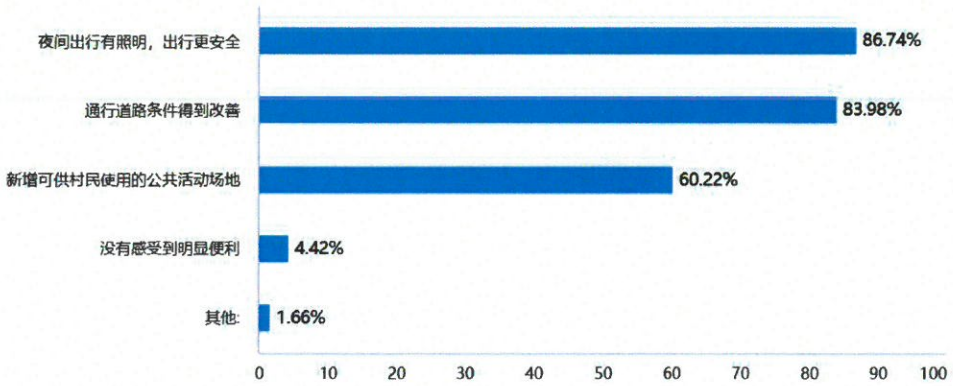

（2）公共活动供给改善效果分析

本项目中公共服务类项目聚焦村级文化、休闲活动场地提质改造，依托场地翻新与功能升级，拓展村级公共活动空间，为村民开展文体交流活

动提供硬件支撑，持续健全乡村公共服务体系。结合镇村工作人员问卷结果，45.16%的受访工作人员认可项目新增村民活动公共场地的建设成效；村民问卷显示，60.22%的受访村民反馈项目新增可供村民使用的公共活动场地，公共休闲配套得到有效补充。

经现场核查，个别公共活动类项目建成后运营管护、使用落地情况不佳，公益效益发挥不足。例如：**东平镇太平村**文化书屋场所提升工程，完成234平方米左右的场地墙体、门窗等改造建设，于2024年8月29日完成整体验收，但项目验收后长期空置，未开展设施配套、未对外开放运营，场地闲置浪费，完全未实现村级文化书屋公共服务供给的预期效益；**湖洋镇桃美村**上街道角落公园建设工程建成后日常管护不到位，步道被枯枝杂草覆盖、草坪退化荒芜，场地休闲功能受限，公共服务效能未能充分发挥。同时，批次内部分项目存在建设进度滞后、落地推进缓慢、个别项目未实施或用途调整等情形，拉低公共服务供给水平，制约了项目整体效益的发挥。

综上，本项目公共活动供给改善的整体成效总体良好。

（3）群众需求匹配及普惠覆盖程度分析

本项目所在村台账登记农业人口总数771,264人，其中农业劳动力483,355人（该数据为批复项目下达资金文件统计口径，不等同于常住人口）。本次实施的多数项目建设内容贴合村民实际需求，普惠覆盖情况良好，能够按立项预期服务目标群体。但少数项目建成后实际使用功能与立项设定的服务定位存在偏差，项目建设目标与群众需求匹配度不足。例如：**东平镇霞林村**便民中心功能室工程加层及外墙装修项目现场房间按会议室布局布设，实际用于村委会会议会务，项目建成后的使用功能与便民中心功能室立项设定的绩效目标存在偏差。**湖洋镇玉柱村**老人活动中心修缮提

升工程备案定性为老年人活动场所公益建设，现场场所按大型会议室标准配置，场所建成后主要用于村级会议会务，项目实际使用功能与立项设定的服务老年群体绩效目标存在偏差，建设用途与申报预期一致性不足，预期公益效益未能充分实现。**东平镇霞林村**老人健身功能室项目立项定位为老人健身功能室，但招标清单内未配置健身设施，清单全部为会议室配套设备，建设单位口述因资金不足将会务设备予以甩项核减。项目建成后场所实际用作村委会会议室，无法实现老人健身服务的预期绩效目标。

本项目以路灯亮化、道路硬化、停车场建设、休闲公共场地打造等民生工程为主，聚焦村民日常出行、休闲活动等公共服务需求。在本次问卷调查的 181 名村民中，87.29%认为项目建设非常符合本村群众实际需要，11.05%认为比较符合，1.66%评价为一般，无受访者认为项目不太符合或完全不符合群众需求，如图 3 所示。

整体来看，本项目建设内容贴合村民生产生活诉求，普惠覆盖效果较好，能够有效回应群众的公共服务需求，仅少数项目存在功能定位与实际使用场景不一致的情况。

图 3 项目建设符合本村群众实际需要问卷调查（村民）

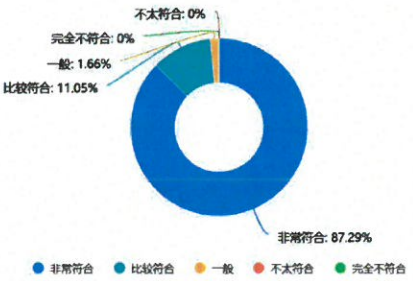

2.产业振兴项目经济效益分析

（1）村集体经济增收情况分析

本指标针对产业振兴项目，考核项目实施后村集体经济增收成效，核

查项目运营、租金等集体收益实现情况。本次参与增收成效评价的经营性子项目共13个，其中6个子项目未达到增收预期，未达标占比46.15%。收益情况详见附件4。具体如下：

①桃城镇洋上村包含2个经营性子项目，农产品展销中心暂未落地，现代产业农产品仓储及展示中心装修工程已完成验收并对外出租，年度租金2.30万元，对比项目财政资金投入规模，年度租赁收益水平偏低，资产投入与产出匹配度不高，未达增收预期。

②东平镇太平村共3个子项目，麻笋运营中心提升项目、综合楼装修工程项目已出租，每年分别实现租金2.58万元、5.20万元；公共服务平台农产品项目完工后仅用于存放环卫垃圾桶，暂未产生集体增收，未达增收预期。

③一都镇美岭村美岭人才孵化基地项目，财政资金投入开展场地装修改造。但竣工投用后未产生租赁及运营收益，改造资产主要供企业主体使用，未能有效支撑村级产业发展，未达增收预期。

④石鼓镇卿园村3个子项目，不夜城改造提升工程两处传统民宿、树下餐厅及庭院修缮工程均已对外出租，按合同约定收取租金，实现集体增收。

⑤呈祥乡呈祥村云山花园提升改造项目尚未实施，暂无收益，未达到增收预期；道路拓宽工程属于配套基础设施，不纳入增收成效评价。

⑥玉斗镇白珩村3个子项目，充电桩一期（非本次补助资金建设）、二期项目在前期自主运营阶段扣除电费成本后盈利微薄，后打包对外出租，合同约定年租金5.00万元，实现集体增收。仓储中心项目暂未落地，光伏发电采购项目完工尚未验收，均暂未形成增收。

整体来看，产业振兴项目累计已投入资金419.66万元，拟投入

1,100.00万元，经营性资产打包出租后年度合计租赁收益19.64万元，项目整体投入产出匹配度不足，部分项目增收效果有限，产业振兴效益未能充分释放。

（2）产业项目辐射带动作用分析

配套村民问卷调查共回收有效问卷181份，64.09%受访者认为产业项目对家庭就业收入帮助比较大，19.34%认为有一点帮助，2.76%认为几乎没有帮助，13.81%表示不涉及产业振兴项目，如图4所示。问卷反映多数受访群众认可产业项目带来的增收就业助力，但问卷属于主观感受调查，难以量化测算项目实际带动的增收、就业规模。本次纳入评价共14个子项目，其中7个子项目无实质辐射带动或带动作用偏弱，占比50%，产业赋能不足。其中，**桃城镇洋上村**仓储项目对外出租但收益偏低，展销中心项目停滞，对村级产业发展、村民就业增收的辐射带动作用有限。**东平镇太平村**麻笋运营中心、综合楼装修项目对外出租，存在少量间接带动效果；公共服务平台农产品项目建成后仅用于存放环卫垃圾桶，未形成产业赋能及辐射带动效果。**一都镇美岭村**美岭人才孵化基地交由教育托管机构使用，建设用途偏离产业振兴建设目标，仅服务单一机构使用，无产业培育、村民就业带动等辐射成效。**石鼓镇卿园村**民宿、树下餐厅投入运营，对本地就业、消费具备一定带动效果，带动效果较好。**呈祥乡呈祥村**云山花园提升改造项目尚未实施，道路拓宽工程尚处于在建阶段，暂未发挥任何产业带动效益。**玉斗镇白珩村**充电桩项目产生少量收益，但带动能力偏弱；仓储中心项目未落地、光伏发电项目完工未验收，暂未形成有效产业赋能。

综合来看，产业振兴子项目带动效果偏弱，未能有效带动村民就业、助推本地产业发展，产业赋能不足。

3.可持续影响分析

（1）长效管护与项目持续效益分析

结合管护人员问卷（有效样本 248 份）、村民问卷（有效样本 181 份）及现场踏勘综合研判：60.89%管护人员反馈无明显运维压力，49.19%反馈管护经费来源不足，15.32%反馈管护人员配置不足，16.94%反馈耗材维护成本较高，12.9%受访者认为群众爱护公共设施意识参差不齐、设施损坏现象较多；90.61%村民观察设施完好可用，少量存在灯具不亮、轻微破损等情况，具体如图 4、图 5 所示。但整体管护工作面临经费保障压力，近半数管护人员反映管护经费来源不足，后续需拓宽管护资金渠道，保障设施长期稳定运行。

图 4 项目后续运维管护工作，当前主要现实压力是（工作人员问卷）

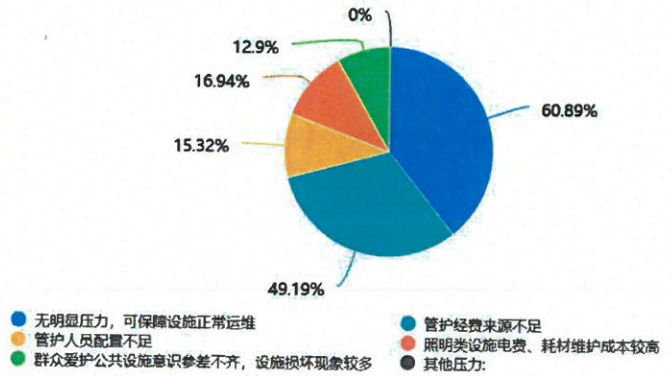

图 5 日常亲眼观察所见，项目设施存在的问题（村民问卷）

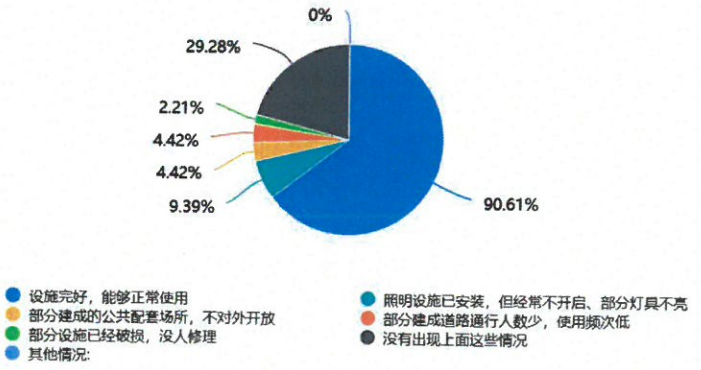

（2）项目长效管护机制完善性分析

各项目已基本建立对应的长效管护制度，明确由村集体作为管护主体，落实设施日常管护责任。

4.满意度分析

本项目村民满意度调查有效样本 181 份，81.22%的受访者对项目表示非常满意，14.92%的受访者表示比较满意，3.87%的受访者评价为一般，无受访者选择不太满意、不满意，综合满意度较高，群众对项目实施成效的认可度较好，如图 6 所示。结合现场核查情况，多数项目能够贴合村民生产生活需求，有效改善村内基础设施条件；少数项目存在功能定位偏差、闲置等问题，但未对整体群众评价形成明显负面影响。

图 6 村民满意度

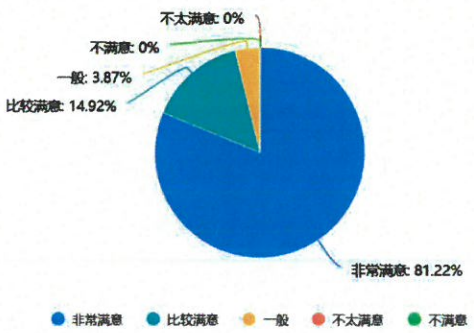

五、存在的问题

（一）效益绩效指标设置精细化不足，目标导向性偏弱

本项目整体绩效目标与建设任务基本匹配，但绩效指标设置精细化程度不足、可考核性偏弱。部分效益类指标表述较为宏观笼统，未结合本批次项目建设实际细化具体预期成效。其中“项目村基层党组织凝聚力战斗

力有所增强”“农村生态环境有效改善”等指标仅采用定性描述，未明确具体评判口径与量化衡量标准，无法依托客观数据核验实际完成情况。定量与定性指标搭配不够均衡，项目社会效益、带动成效难以精准评价，绩效目标约束和导向作用发挥不足。

（二）个别项目立项论证深度不足，预算编制科学性有待提升

部分项目在预算编制、立项申报阶段，对用地审批、土地性质、征地协调等前置实施条件研判不够充分，未能充分识别项目落地潜在风险。例如，**桃城镇洋上村**2024年产业振兴示范村农产品展销中心子项目，因土地审批手续未办结，项目无法推进；**玉斗镇白珩村**2025年产业振兴示范村仓储中心子项目，受土地性质限制，用地手续无法获批，项目停滞；**达埔镇岩峰村**八九组角落排洪排水及道路硬化项目，前期未充分研判征地难度，项目暂未实施。个别项目前期论证不够扎实，项目获批后难以落地，财政资金难以及时转化为实物工作量。

（三）专项资金使用管理不够规范，存在核算不规范及非有效支出问题

抽样核查过程中发现，本项目资金整体使用方向基本合规，但部分项目在会计核算、资金匹配使用方面仍存在不规范情形，具体如下：

在会计核算方面：部分村居一事一议项目会计科目核算不规范，未设置一事一议专项科目核算。例如**下洋镇下洋村**亮化工程三期一事一议资金，收入会计科目为“补助收入-其他”；**下洋镇上姚村**领头格栈道工程一事一

议资金，会计科目为“补助收入-其他”；**下洋镇长汀村**路灯亮化工程一事一议资金，会计科目为“专项应付款-其他、补助收入-其他”；**锦斗镇云路村**角落路路灯修复一事一议资金，收入会计科目为“专项应付款-农村公益建设”；**达埔镇乌石村**村部周边路灯亮化工程一事一议资金，收入会计科目为“专项应付款-其他”等。

在资金使用方面：本次核查共核减非有效支出金额97.52万元，部分项目支出内容与批复文件、项目立项内容匹配性不足，存在支出认定不合规情形。具体案例如下：**达埔镇新溪村**Y85洑岱线晋级工程，与县财政局指标文件下达的村道硬化项目名称不一致，Y85洑岱线晋级工程中标金额214.49万元，永春县民政局、县财政局2024年扶持老区建设县级补助资金30.00万元，永春县交通运输局分别转拨2024年第二批、2025年度第一批交通项目市级补助资金8.00万元、33.90万元。从县交通局下达的文件来看，该路段路线编码为Y085350525，属于乡道，与财政指标文件标注的村道属性不一致，该支出不予认定为本项目有效支出。**锦斗镇卓湖村**大坪格至300米入口新建道路工程项目，备案表该项目预算总额60.00万元，建设内容为村内道路其他路面1.20千米，备案开工日期2024年6月28日；资金支出凭证对应的项目名称为永春县锦斗镇卓湖村X315线至大坪格公路入口路基建设工程，建设内容为路基300米，开工日期 2023年9月4日，完工日期2023年11月29日，支出内容与文件补助项目不一致。因此2024年支出20.00万元、2025年支出14.00万元，均不予认定为本项目有效支出。此外，部分项目发生的前期费用、设计费、结算审核费等二类费用，按规定不予认定为本次奖补资金有效支出，具体详见附件8。

（四）项目过程管理不够严谨，程序时效与招标采购管控存在瑕疵

少量子项目在立项申报、名称统筹、招标管控及资料时序管理等方面仍存在瑕疵，项目管理规范性有待提升。例如：**石鼓镇卿园村**卿园寨亮化工程项目招标环节，福建泉州市君慕建设有限公司、福建泉州市跨越集采供应链管理有限公司、福建泉州市坤筑发展有限公司三家单位参与招标文件响应，坤筑发展为本项目中标单位。三家企业股权层面相互独立，但存在潜在关联线索，君慕建设与跨越集采留存相同联系电话 1398****2168，坤筑发展 2022 年 8 月工商变更后联络员变更为康巧华，康巧华同时为君慕建设法定代表人及 100%持股股东，投标单位存在潜在关联风；**达埔镇金星村** 2025 年一事一议财政奖补申请表项目名称为金星村天磨线公路驿站工程，与财政指标下达文件“金星村天磨线排洪防滑坡”项目名称不一致。**桃城镇洋上村**新坂堂右侧民居修缮工程项目招标公告发布时间为 2024 年 4 月 23 日，补充公告发布时间为 2024 年 4 月 26 日（变更项目名称）。但 2024 年 4 月 23 日的招标活动日程及招标代理机构编制的招标文件均已使用变更后的项目名称，2024 年 4 月 24 日收到的投标确认函亦按新名称填写，项目招标变更流程时序不规范、程序闭环管理不到位。**达埔镇蓬莱村**路灯类项目，先后以“太阳能路灯改造”“路灯改造”“达埔镇蓬莱村太阳能路灯建设项目”不同项目名称分年度申报一事一议财政奖补资金，各次申报项目工程预算总额不一致。本次实施项目中标金额 41.30 万元，财政核定补助金额 42.50 万元，结算审核金额 43.81 万元，且本次项目财政核定补助金额、结算审核金额均高于中标金额，项目立项测算及申报管控严谨性不足。

（五）个别项目建设管控不严，存在建设内容偏差及工程质量缺陷

工程质量缺陷方面：本次现场抽查58个项目中，**石鼓镇卿园村**寨卿线路基塌方修复工程（补助资金50.00万元）于2026年3月25日完成竣工验收；绩效评价组2026年9月9日现场核查时，该项目路面存在长条裂缝，存在工程质量缺陷。

建设内容管控方面：呈祥乡呈祥村百姓大舞台项目设计图纸及竣工图载明窗帘工程量146.30㎡，经现场实测及结算审核工程量仅约80㎡，项目未按规定履行工程变更手续，存在未按设计内容实施的情形，竣工图编制内容与现场实际建设状况不符。**东平镇霞林村**老人健身功能室项目中标价204,529.00元，结算价141,691.00元，较中标价降幅30.72%，核减金额67,341.50元，项目实施阶段对工程内容进行大幅甩项，实际建设内容与立项方案存在一定差异。

（六）项目实施进度管控偏弱，项目未按批复节点完工问题较为普遍

产业振兴项目由多个子项目组成，实施周期跨度较大，各子项目推进节奏存在明显差异。例如：**桃城镇洋上村**2024年产业振兴示范村项目下设洋上村农产品展销中心、现代产业农产品仓储及展示中心装修工程两个子项目，项目整体推进滞后，综合效益未有效显现，其中洋上村农产品展销中心受土地审批手续尚未办结影响，前期工作停滞，暂未落地实施，土地审批环节多、办理周期较长。**一都镇美岭村**2024年产业振兴示范村各子项目建设进度不均衡，莲花山农村休闲观光旅游项目直至2026年8月才启动

招标，建设时序滞后。**呈祥乡呈祥村** 2025 年产业振兴示范村包含云山花园提升改造项目、云山花园提升改造（道路拓宽）工程，截至 2026 年 9 月，道路拓宽工程处于在建状态，云山花园提升改造项目尚未实施，处于招投标阶段，整体推进缓慢。**玉斗镇白珩村** 2025 年产业振兴示范村包含白珩村公路停车区充电桩项目（二期）、218.72 千瓦光伏发电采购项目、仓储中心（暂定名）三个子项目，各子项目推进进度不一，仓储中心项目因土地性质变更暂未获批，无法继续推进；光伏发电采购项目已基本完工，尚未组织竣工验收。

一事一议项目中也存在部分项目推进缓慢、未开工或暂未实施情况。例如：**东关镇东华社区**边坡治理工程已完成招标，受施工方时间安排因素影响尚未进场开工；**湖洋镇桃美村**济美小区道路硬化建设工程暂未实施；**达埔镇岩峰村**八九组角落排洪、排水及道路硬化项目因涉及土地征用，计划 2026 年 9 月中旬开工、12 月完工。

对照财政部门各批次项目批复文件的工期要求，多批次项目存在未按批复节点完工的情况。依据《永春县财政局关于 2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目的批复》（永财农〔2024〕5 号），要求项目 5 月中旬全部动工，6 月底完成全部工程任务，该批次批复 84 个项目，65 个项目实际完工时间为 2024 年 7 月至 2025 年 8 月，未按期完工。依据《永春县财政局关于 2024 年第二批村级公益事业建设财政奖补建设项目的批复》（永财农〔2024〕9 号），要求 11 月底完成全部工程任务，该批次批复 17 个项目，全部项目实际完工时间在 2024 年 12 月至 2025 年 12 月期间，均未按批复节点完工。依据《永春县财政局关于 2024 年第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目的批复》（永财农〔2024〕16 号），要求项目 11 月中旬全部动工，3 个月内完成全部工程任务，该批次批复 36 个项目，8

个项目完工时间落在2025年3月至2025年11月，未按期完工。依据《永春县财政局关于2024年第四批农村公益事业建设财政奖补建设项目的批复》（永财农〔2025〕1号），要求3个月内完成全部工程任务，该批次批复5个项目，4个项目完工时间在2025年7月至2025年12月期间，未按期完工。综合统计，142个项目中有94个项目未按批复时限完工，延期项目占比高于30%，项目延期现象较为普遍。

项目实施受村集体自筹资金筹措压力较大、群众诉求协调沟通难度高、雨季天气、征地占地等因素制约，项目实施过程中的进度管控力度不足，未能及时预判、化解各类阻滞因素，项目实施进度管控成效有待提升。

（七）少数项目建设功能定位偏离、长效管护存在短板，公共效益发挥不够充分

现场核查发现少数项目建成后实际使用功能与立项设定的服务定位存在偏差，项目建设目标与群众需求匹配度不足。例如：**东平镇霞林村**便民中心功能室工程加层及外墙装修项目现场房间按会议室布局布设，实际用于村委会会议会务，项目建成后的使用功能与便民中心功能室立项设定的绩效目标存在偏差。**东平镇霞林村**老人健身功能室项目立项定位为老人健身功能室，但招标清单内未配置健身设施，清单全部为会议室配套设备，建设单位口述因资金不足将会务设备予以甩项核减，项目建成后场所实际用作村委会会议室，无法实现老人健身服务的预期绩效目标；**湖洋镇玉柱村**老人活动中心修缮提升工程备案定性为老年人活动场所公益建设，现场场所按大型会议室标准配置，场所建成后主要用于村级会议会务，项目实际使用功能与立项设定的服务老年群体绩效目标存在偏差，建设用途与申报预期一致性不足，预期公益效益未能充分实现；**湖洋镇玉柱村**自然灾害

避灾点改造提升项目配套购置岩板大圆桌及实木餐椅，家具配置标准偏高，与避灾点作为灾害临时安置场所的应急保障定位、物资使用需求匹配度不足，设施选型未充分结合应急场所实用简约的建设要求。

结合管护人员问卷、村民问卷及现场踏勘综合研判，项目长效管护仍存在明显短板，运维保障压力较为突出。从管护层面来看，49.19%管护人员反馈管护经费来源不足，15.32%反馈管护人员配置不足，16.94%反馈设施耗材维护成本较高，运维保障要素存在短板；同时12.9%受访者反映群众爱护公共设施意识参差不齐，设施损坏现象时有发生。从现场运维成效来看，虽然绝大多数公共设施完好可用，但少量项目存在灯具不亮、设施轻微破损等问题，个别项目管护不到位。其中**东平镇太平村**文化书屋项目验收后长期空置、未对外开放运营，存在场地闲置浪费问题；**湖洋镇桃美村**角落公园建成后日常管护薄弱，场地环境荒芜，未实现常态化长效运维，公益服务效益未能充分长效发挥。同时部分项目建设推进滞后，个别项目落地成效不佳，整体公共服务效益未完全释放。

（八）产业振兴项目建成后资产收益偏低，辐射带动作用成效有限

本次参与村集体增收成效评价的产业振兴经营性子项目共13个，整体存在资产投入产出匹配度不足、增收效益不达预期、产业辐射带动能力偏弱等问题，其中6个子项目未达到增收预期，未达标占比46.15%。从项目收益情况来看，**桃城镇洋上村**农产品展销中心暂未落地，现代产业农产品仓储及展示中心装修工程已完成验收并对外出租，年度租金2.30万元，对比项目财政资金投入规模，年度租赁收益水平偏低，资产投入与产出匹配度不高，未达增收预期。**东平镇太平村**麻笋运营中心提升项目、综合楼装

修工程项目已出租，虽每年分别实现租金2.58万元、5.20万元，但公共服务平台农产品项目完工后仅用于存放环卫垃圾桶，暂未产生任何集体增收，增收成效未达预期。**一都镇美岭村**美岭人才孵化基地项目，财政资金投入开展场地装修改造，但竣工投用后未产生租赁及运营收益，改造资产主要服务企业主体使用，未能有效赋能村级集体经济增收。**呈祥乡呈祥村**云山花园提升改造项目尚未实施，暂无任何集体收益。**玉斗镇白珩村**仓储中心项目暂未落地，光伏发电采购项目完工尚未验收，均未形成增收效益；充电桩一、二期项目前期自主运营阶段扣除电费成本后盈利微薄，打包对外出租，合同约定年租金5.00万元。本次纳入评价的经营性产业子项目累计已投入资金419.66万元，拟投入1,100.00万元，经营性资产打包出租后年度合计租赁收益19.64万元，整体项目资金投入体量与实际收益水平不匹配，产业增收质效偏低。

同时，产业振兴辐射带动的综合效益未能充分释放，本次评价14个子项目中，7个子项目无实质辐射带动作用或带动效果偏弱，占比达50%。**桃城镇洋上村**仓储项目对外出租但收益偏低，展销中心项目停滞，对村级产业发展、村民就业增收的辐射带动作用有限。**东平镇太平村**公共服务平台农产品项目功能闲置，未形成产业赋能及辐射带动效果。**一都镇美岭村**美岭人才孵化基地实际用途偏离产业振兴建设定位，仅服务单一机构使用，无产业培育、村民就业带动等辐射成效。**呈祥乡呈祥村**云山花园提升改造项目尚未实施，道路拓宽工程尚处在在建阶段，暂未发挥辐射带动作用，无实质带动效果。**玉斗镇白珩**村充电桩项目带动能力薄弱，其余子项目暂未形成有效产业赋能。整体来看，本批次产业振兴项目存在资产盘活利用率不高、增收渠道单一、产业赋能不足等问题，项目长效造血能力偏弱。

（九）少数项目备案归档资料要素不全，档案管理存在薄弱环节

抽查发现极少数项目备案归档资料存在要素缺失问题，例如**湖洋镇玉柱村**老人活动中心修缮提升工程，项目备案表未设置建设内容填报栏目，备案材料仅登记项目名称，缺少项目建设内容、建设规模等关键备案信息，备案资料要素不全，项目资料归档管理仍有提升空间。

六、有关建议

（一）细化绩效指标设置，强化目标刚性约束

建议后续在项目申报、编制绩效目标时，结合项目类型细化效益类指标，减少“农村生态环境有效改善”这类仅定性、难以核验的笼统描述，配套清晰可落地的评判口径，方便绩效评价核验。绩效指标一经批复不得随意更改，仅在发生政策变动、不可抗力等客观重大变化并履行报批手续后方可调整。举例：产业振兴经营性项目，效益指标可设置项目建成后年增加村集体收入金额；村级道路亮化等公益类一事一议项目，效益指标可设置项目直接受益覆盖人口数量。产业类指标可依托租赁合同、财务收益凭证统计；公益类项目可依托立项台账、问卷调查统计评价，切实提升绩效指标可评价性，更好地发挥绩效目标约束作用。

（二）做实项目前期论证，提升预算编制科学性

建议乡镇、各村在项目立项申报前，组织人员开展实地踏勘，逐项核查土地性质、用地报批条件、征地群众沟通协调难度等前置条件。对用地

审批难度大、征地矛盾突出、落地不确定性较高的项目审慎申报，从源头规避项目获批后无法开工、长期搁置停滞的问题。预算编制阶段严格依据现场实况、施工图纸、工程量清单、市场行情精准测算造价，充分预判施工过程中的各类潜在影响因素，杜绝估算式、笼统化编报预算，提高预算编制的合理性与精准度，推动财政资金高效转化为实物工程量。

（三）规范财务核算管理，严格把控资金有效支出

进一步规范村级财务核算工作，一事一议专项资金单独设置对应会计科目进行核算，杜绝统一归集在“补助收入 - 其他”这类笼统科目混同记账。建立支出事前审核、事中把控机制，业务经办人员报销时必须准确注明对应项目名称、资金用途、建设内容；财务人员在资金拨付前，严格对照财政指标文件、立项批复逐项核对匹配度。针对项目名称与批复不符、项目建设属性不一致、二类费用超范围列支等不合规情形，财务岗位不予报销、原路退回，详细告知经办人问题症结，指导补齐资料、修正支出内容、调整报销事项，整改合规后再予以审核拨付，严格落实专款专用要求，确保财政奖补资金精准用于批复的项目建设内容。

（四）健全项目管控体系，规范招标采购及项目名称全流程管理

在项目实施全过程做好项目名称统一管理，立项申报、财政指标下达、招标文件、合同、备案表等资料使用的项目名称保持一致，避免同一项目多个名称，防止出现项目识别混淆、申报内容错位的情况。开展项目申报资料初审时，核对备案表、奖补申请表和财政下达文件的项目名称，发现名称不一致及时修正。

采购实施阶段，合理安排工作时序，前期市场询价仅作为了解市场行情、测算预算控制价的参考依据。组织询价、招标工作时，可通过企查查、AI等渠道初步核查供应商之间的关联线索，核查联系电话、工商联络员、股东、法定代表人等信息，排查潜在关联投标风险。

招标过程中项目名称、采购内容等信息需要变更的，要严格按照规定时序发布补充公告，补充公告应当在对应变更内容生效前发布，不能招标文件、投标文件提前使用变更后的名称，后续才补发变更公告，确保招标变更程序合规。项目申报测算环节，结合工程量、中标价合理预估资金需求，提升立项申报资金测算准确度，避免出现补助核定金额、结算金额高于中标金额的情况。

（五）强化施工现场管控，严控建设偏差与工程质量

项目开工前，乡镇、村要组织施工、监理人员共同核对立项批复、施工图纸与工程量清单，明确施工范围，留存交底记录，从源头避免随意删减施工内容。

施工期间，乡镇会同村级现场管理人员，在基础完工、主体成型等关键节点开展现场核查，对照图纸核对实际施工内容，发现漏项、工程量不足的情况，当场督促施工单位整改。 如果现场客观条件确实需要调整建设内容、施工方案或者工程量，由村收集现场佐证材料，先提交变更申请，经乡镇审核、按权限报批并完成公示后，方可实施变更，不允许先施工再补变更手续，或是不履行变更手续直接改动工程内容。

工程完工组织竣工验收时，验收人员实地比对现场实体、竣工图纸与结算资料，逐项核对建设内容。竣工图要根据现场实际施工情况绘制，真实反映完工现状，保证现场实体、竣工图纸、结算工程量三者一致，及时

发现路面开裂、设施破损、分项工程漏建等质量问题，问题整改到位后方可通过验收。

（六）压实进度管控责任，建立项目动态推进机制

建立一事一议、产业振兴项目清单化、节点化动态管理制度，对所有在建、待建项目建立台账，细化开工、施工、竣工、验收各时间节点，实行常态化跟踪调度。项目前期提前预判用地审批、征地协调、群众沟通、自筹资金落实、施工队伍进场等堵点难点，提前介入协调、提前化解制约因素。针对进度滞后、逾期未完工的项目，逐项剖析滞后原因，分类制定提速推进方案，实行月度调度、季度通报，倒逼项目提速落地。结合县域雨季天气、农忙时节、群众协调周期等客观因素科学排布工期，合理预留施工缓冲期，有效降低项目延期率，全面提升项目实施推进质效。

（七）精准匹配项目功能，完善长效运维管护机制

严格对标项目立项公益定位推进建设，精准匹配群众需求，杜绝便民服务中心、老年活动场地、健身功能室等公益项目建成后擅自变更用途、长期用作村级会议办公场所，彻底解决项目功能定位偏离、公益价值弱化问题。设施设备采购立足实用、简约、适配原则，结合应急避灾点、休闲场地等场所的实际使用需求选型配置设备，杜绝采购标准过高、与实际用途不匹配的设施，避免财政资源闲置浪费。项目验收移交后，压实村级主体管护责任，多渠道筹措管护经费、配齐日常管护人员，建立常态化巡查、保洁、维修养护机制。同步加强村民宣传引导，提升群众公共设施爱护意识，减少人为破损，整改场地空置、设施荒芜、管护缺位等问题，充分释放项目长期公益效益。

（八）盘活产业项目资产，提升增收赋能辐射实效

对产业振兴经营性子项目开展全面梳理盘点，针对项目未落地、建设停滞、资产闲置、租赁收益偏低、投入产出不匹配等问题，分类制定盘活整改方案。对已完工的经营性资产，通过规范公开租赁、优化运营模式、丰富经营业态等方式，拓宽村集体增收渠道，提升财政投入资产的产出回报率。改变以往“重建设、轻运营、弱带动”的建设模式，在项目前期策划阶段同步谋划后期运营方案，兼顾集体增收与产业带动效益，充分依托产业项目带动本地村民就业、农产品产销、乡村消费，强化产业辐射赋能作用，持续增强村集体经济自我造血与长效发展能力。

（九）规范项目档案管理，压实村级归档履职责任

依据《永春县加强村级公益事业一事一议项目管理补充规定》（永政办〔2017〕121号）及项目《操作规程》相关档案管理要求，乡镇财政所、村委会做好一事一议及产业振兴项目全流程资料归集归档工作。针对本次核查发现的部分村居备案资料填报不够细致，如备案表仅登记项目名称、核心信息填写不全等情况，组织各村开展项目档案自查工作。乡镇对照文件及操作规程配套的项目档案资料清单，统一备案表填报规范，明确备案表需要完整填写项目名称、建设地点、建设内容、建设规模、投资金额、建设周期等关键内容，落实一项一档管理，安排专人负责资料收集，按照立项备案、招标采购、合同签订、施工实施、竣工验收、结算审计的顺序，及时归集项目全套资料。各村对照资料清单逐项核对档案，要素填写不完整的及时完善，资料缺失的及时补齐，做到项目资料随项目推进同步收集、及时归档，保证档案要素齐全、时序清晰、数据准确，为项目监管、绩效

评价及各类核查提供完整资料支撑。

七、其他说明

1.本次绩效评价工作由鑫永安（厦门）集团有限公司依托永春县财政局、各乡镇以及各项目建设单位提供的项目批复资料、建设台账、会计凭证、财务核算资料、项目档案等全部基础资料开展评价。评价过程严格基于送检现有资料进行核查分析，本次评价存在部分建设单位未按要求提供全部所需资料的情况。各资料报送单位对所提供资料的真实性、合法性、完整性、准确性、时效性承担全部主体责任。

2.本次绩效评价严格按照既定评价范围开展，评价边界清晰，不延伸、不扩面评价本次任务以外的其他项目及资金。本批次项目数量多、覆盖乡镇村居范围广，本次评价采用抽样核查方式实施，评价结论基于抽样样本情况综合形成，样本之外未抽中项目的情况不在本次评价直接核查范围内。同时，受村级财务核算规范性限制，部分村居存在专项资金归集不细化、项目支出未及时结转、专项经费混记等情况，账务无法精准区分单个项目一一对应的实际列支明细，难以精准核对单项项目实际支出是否超项目总预算、财政补助资金是否超范围使用，相关评价受限情况特此说明，项目收支数据依据单位报送的项目收支总账统计金额。

3.本次绩效评价现场核查仅针对项目外观现状、建设完成情况、设施完好情况、现场可见问题开展核查研判，不替代住建、安监、质检等专业部门的工程质量检测与专业鉴定。评价不对工程内部结构、隐蔽工程、工程材质荷载、结构安全性能等专业质量指标进行检测及定性判定，仅对现场可视、可核查的外观缺陷、破损情况、漏建情况进行客观统计与问题记录，工程内在质量、结构安全等专业问题以行业主管部门专业检测鉴定结

论为准。

八、附件

附件 1 农村公益事业建设项目（2024-2025 年）绩效评价指标体系

附件 2 评价工作流程

附件 3 现场抽查项目清单

附件 4 项目建设情况及收益情况

附件 5 村民问卷调查

附件 6 乡镇、村工作人员问卷调查

附件 7 2024 年-2025 年农村公益事业建设项目资金使用及建设情况

附件 8 不予认定支出明细

附件 9　2024 年-2025 年农村公益事业建设项目收支及实施情况（按乡镇统计）

附件 1 农村公益事业建设项目（2024-2025 年）绩效评价指标体系

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
项目决策（17 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性	3.00	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 具备一个得分要素，增加 0.6 分。	3.00	本项目涵盖村级公益事业一事一议奖补及乡村产业振兴配套项目，立足县域乡村基础设施短板与产业发展需求，立项导向清晰、依据充分。项目聚焦乡村公益设施完善、人居环境提升、特色产业培育等重点领域，契合国家乡村振兴战略及福建省农村综合改革、一事一议财政奖补相关政策导向，建设方向符合现行法规及专项管理要求。 从履职与财政事权角度来看，开展村级公益事业建设、扶持乡村产业发展，是财政部门统筹农村综合改革资金、强化乡村建设投入保障的法定职责，也是乡镇完善村级公共服务、补齐民生短板、推动属地产业发展的重点工作，权责清晰、履职到位。从财政投入属性来看，项目均为村级普惠性公益民生工程，属于公共财政重点保障领域，资金投入符合各级财政事权与支出责任划分原则，且未发现项目重复建设、交叉重叠等问题，整体立项依据充分、合规性良好。
		立项程	3.00	评价要点：		本批次项目基本按照一事一议及产业振兴项

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
		序规范性		①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 具备一个得分要素，增加 1 分。	2.00	目申报管理规定开展立项工作，整体履行村级集体决策、乡镇初审、县级审核的规范立项流程，立项程序总体合规。但部分项目前期调研论证、落地条件研判不够细致，对用地报批、土地性质、施工条件、设计缺陷、材料供应等制约因素预判不足。个别项目因前期设计不完善、用地手续未办结、土地征迁滞后、施工时序冲突等问题，出现开标延后、无法进场施工、项目停滞未落地等情况，项目前期精细化论证及风险预判工作有待进一步加强。
	绩效目标（7 分）	绩效目标合理性	4.00	评价要点： ①是否具有可操作性和可达性； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 具备一个得分要素，增加 1 分。	3.00	本项目设置了“支持农村公益设施建设数量≥251 个”“支持产业振兴示范村数量 6 个”“农村公益事业建设工程验收合格率 100%”“项目区农民满意度≥90%”“项目区基层干部满意度≥90%”“项目村基层党组织凝聚力战斗力有所增强”“农村生态环境有效改善”等绩效指标。绩效目标与一事一议财政奖补、产业振兴示范村建设的项目工作内容相关，目标设定结合项目资金规模统筹考量，整体具备可操作性，并已将总体绩效目标分解为对应建设任务，设置项目数量、工程合格率、群众满意度等指标，指标内容与项目计划任务相对应。但绩效目标设置存在不足：部分效益类目标表述较为宏观，未结合本批次项目建设内容明确预期成效；同时部分指标精细化不足，如“项目村基层党组织凝聚力战斗力有所增强”“农村
		绩效目标明确性	3.00	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应；	2.00	

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
				具备一个得分要素，增加 1 分。		生态环境有效改善”仅为定性描述，未明确评判口径与衡量标准，无法依托客观数据核验目标完成情况，效益类指标多采用定性描述，缺少可量化的效益指标支撑。
	预算编制（4 分）	预算编制科学性	2.00	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 具备一个得分要素，增加 0.5 分。	1.50	本项目一事一议财政奖补及产业振兴配套项目预算编制基本结合项目建设内容开展资金测算，预算内容与项目建设任务总体匹配，资金投入规模与项目工作量基本对应，预算编制履行村级申报、乡镇初审、县级审核的逐级审核流程。但经核查，个别项目前期立项论证与实施条件研判不够严谨，预算编制阶段未充分核查用地审批、土地属性、征地条件等关键前置要素，对项目落地可行性判断不足。如桃城镇洋上村 2024 年产业振兴示范村农产品展销中心子项目，立项后土地审批手续迟迟未能办结；玉斗镇白珩村 2025 年产业振兴示范村仓储中心子项目，前期未核实土地性质限制，项目立项后用地手续无法获批，项目停滞；达埔镇岩峰村八九组角落排洪排水及道路硬化项目，前期未充分研判土地征用难度，项目未能按期落地。上述情况反映部分项目预算编制前期调研论证深度不足，预算编制科学性有待进一步提升。
		资金分配合理性	2.00	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项	2.00	本项目资金分配严格参照《福建省农村综合改革转移支付资金管理办法》（闽财〔2024〕33 号）相关制度规定执行，采用因素法开展资金

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
				目单位或地方实际是否相适应。具备一个得分要素，增加 1 分。		测算分配，综合结合年度预算执行成效、资金使用规范度、日常监管落实情况等核心指标统筹分配资金，并结合永春县实际财力情况进行适度调节。其中，一事一议项目选定村民民主议事程序议定的村内户外公益事业建设范畴，重点支持村容村貌提升、人居环境整治、村内道路修缮、农田水利配套、公共活动场所完善等基础性民生工程；乡村产业振兴示范村项目严格按照省级年度申报通知及申报标准规范流程申报，由县级财政牵头组织申报初审，市级财政筛选择优向上推荐，最终经省财政厅审核确认后下达定额专项补助资金。本次项目资金实行总量统筹管控模式，同步设置 10.00 万元最低补助保底机制，资金下达规模基本适配各村公益事业及产业振兴建设实际需求。
项目过程（20 分）	资金管理（10 分）	资金到位率	3.00	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：本年度内落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度内预算安排到具体项目的资金。	3.00	本次项目预算资金 4,906.25 万元，根据《永春县财政局关于 2024 年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目的批复》（永财农〔2024〕5 号）、《永春县财政局关于 2024 年第二批村级公益事业建设财政奖补建设项目的批复》（永财农〔2024〕9 号）等多份文件及财政局支出明细账显示，本项目下达资金 4,906.25 万元，与预算资金匹配，资金到位率 100%。
		预算执行率	3.00	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。		根据县财政局、各乡镇、村居提供的收支台账、明细账统计，受部分项目实施进度偏慢影响，

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
				实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。	2.64	财政收回指标暂缓下达资金642.00万元，实际下达到各村居的财政补助资金为4,264.25万元，剔除不符合规定支出的前期费用、支付内容与项目不符、项目进度滞后未及时支付等原因后，支出3,755.40万元（不含其他来源资金支付的金额），补助资金剩余金额508.85万元，预算执行率88.07%。项目整体资金支出推进情况良好，大部分项目能够按照项目实施进度支付工程款。
		资金使用合规性	4.00	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备一个得分要素，增加1分。	3.00	本次依据各乡镇（村）收支台账、明细账目开展资金合规核查，项目资金拨付审批手续基本完整，资金使用总体符合预算及合同要求，未发现截留、挤占、挪用等重大违规问题。但抽样核查发现部分项目存在会计核算不规范、资金匹配度不足等问题。会计核算方面，部分村居未单独设置一事一议专项核算科目，存在资金统一归入其他补助、其他应付款科目核算的情况，核算口径不统一。资金使用方面，本次共核减非有效支出97.52万元，存在项目名称与批复文件不一致、道路属性与立项指标不符、二类费用列支不合规等问题，相关支出不予认定为项目有效支出。
	组织实施（10分）	管理制度健全性	3.00	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合	3.00	本项目已构建省、市、县三级财务及业务管理制度体系。省级出台农村公益事业财政奖补资金、项目管理、绩效评价相关实施办法；泉州市配套市级乡村振兴补助资金管理规定，对项

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
				法、合规、完整。 具备一个得分要素，增加 1.5 分。		目申报实施、资金使用、进度管控、绩效评价等事项予以规范；永春县印发《永春县加强村级公益事业一事一议项目管理补充规定》（永政办〔2017〕121 号），结合本地实际细化奖补原则、项目申报筛选、实施验收、资金监管、监督考核等实操要求。整套制度文件合法合规，覆盖项目全流程业务与资金管理，制度体系健全，能够满足项目管理工作需要。
		制度执行有效性	4.00	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 具备一个得分要素，增加 1 分。	3.00	本次抽样核查显示，本批次项目整体严格遵守农村公益事业一事一议财政奖补相关法律法规及各级项目管理规定，项目实施、资金拨付均按制度规范执行。针对已批复无法实施的项目，均由乡镇依规申报调整，经县级财政审核批复后完成项目变更，其中累计合规调整 7 个项目，完整履行项目变更报批程序。项目合同、验收报告等核心资料基本归档齐全，项目实施各项保障条件落实到位。抽查发现极少数项目资料归档管理存在短板，湖洋镇玉柱村老人活动中心修缮提升工程备案表要素缺失，未填报项目建设内容、建设规模等关键信息，仅登记项目名称，备案资料完整性不足，项目精细化档案管理水平有待进一步提升。
		项目实施程序规范性	3.00	评价要点： ①一事一议项目是否履行村民议事决策程序； ②项目立项、筹资等关键环节是	2.00	现场核查表明，本批次一事一议及产业振兴项目总体能够落实村民议事、民主决策、立项公示等相关要求，项目申报流程公开透明，采购招标程序整体合规，项目储备、申报及实施的

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
				否按要求开展公示； ③采购、招标、询价方式选择及流程是否合规。 每一项评价要素全部落实到位得1分；仅部分项目存在瑕疵的，该项不得满分。满分3分。		程序性管理总体规范。但少量项目在立项名称管理、招标询价管控、资料时序管理上存在瑕疵。一是部分投标企业存在潜在关联线索，存在投标风险；二是个别项目备案、申报名称与财政指标文件名称不匹配；三是个别项目招标变更时序颠倒，程序闭环管理不到位；四是蓬莱村路灯项目多次申报名称不统一，立项测算、申报管控严谨性不足。总体而言，项目程序性管理基本规范，但立项、采购环节细节管控仍需加强。
项目产出（26分）	产出数量（12分）	项目建设完成率	12.00	评价要点：考核年度计划项目实际完工交付情况，按项目个数核算完成水平。支持农村公益设施建设数量≥251个、产业振兴配套项目4个、支持产业振兴示范村数量6个。 计算公式：项目建设完成率=已完工项目数/计划总项目数×100% 评分标准： A.项目建设完成率100%，得12分； B.完成率≥90%且＜100%，得10-11分； C.完成率≥80%且＜90%，得8-9分；	10.50	本项目计划支持农村公益设施建设项目不少于251个、产业振兴县级配套资金项目4个、产业振兴示范村6个。本项目分为一事一议项目、产业振兴子项目两类，其中一事一议项目275个，6个产业振兴示范村项目拆解为19个独立子项目，合计纳入评价子项目294个。各子项目按照自身实施状态，单独判定完工、在建、未实施，避免因同一大项目下部分子项目滞后，直接判定整体项目未完工，客观反映项目实施真实情况。294个子项目中，完工281个、在建6个、未实施7个，项目建设完成率95.58%。本项目绝大部分子项目已完成建设并交付使用；少量项目处于在建阶段，个别项目尚未启动实施，项目整体完工交付水平较高。

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
				D. 完成率≥70%且＜80%，得 3-5 分； E. 完成率＜70%，得 0-2 分。		
	产出质量（8 分）	工程建设质量达标情况	4.00	评价要点：现场核查工程有无肉眼可见明显外观缺陷，同时核查是否发生工程质量事故、存在主管部门认定重大质量隐患。 A. 问题占比为 0，且无质量事故、重大隐患，得 4 分； B. 问题占比不超过 5%，无质量事故、重大隐患，得 3 分； C. 问题占比 5%至 10%，无质量事故、重大隐患，得 2 分； D. 问题占比超过 10%，或存在质量事故、重大隐患，得 0 分。	3.00	本次现场抽查 58 个项目，大部分工程未发现肉眼可见的明显质量缺陷，未发生工程质量事故，不存在主管部门认定的重大质量隐患。其中石鼓镇卿园村寨卿线路基塌方修复工程（补助资金 50.00 万元）于 2026 年 3 月 25 日完成竣工验收。绩效评价组 2026 年 9 月 9 日现场核查时，该项目路面存在长条裂缝，存在肉眼可见质量缺陷，抽查存在外观缺陷项目占比不超过 5%。
		设施配置完备性	4.00	评价要点：核查建成配套设施是否与批复实施方案、设计文件（含已获批变更）一致。 A. 全部符合要求，得 4 分； B. 存在问题项目占比不超过 5%，得 3 分； C. 存在问题项目占比 5%至 10%，得 2 分； D. 存在问题项目占比超过 10%，得 0 分。	3.00	本次核查总体情况良好，绝大多数项目按批复方案、施工图纸及建设规范组织施工，建设内容、规模、设施配置基本符合立项设计要求，建成设施功能完整，能够匹配公益服务定位，项目实施规范性整体较好。但问题项目占比不超过 5%，个别项目现场建设内容与设计文件存在偏差，未按规定履行工程变更手续。例如呈祥乡呈祥村百姓大舞台项目图纸工程量与现场实测工程量差距较大，竣工图与现场实际不符；东平镇霞林村老人健身功能室项目实施中大幅甩项，结算较中标价降幅较大，实际建设

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
						内容与立项方案存在差异。总体项目设施完备程度较高，但少数项目存在建设内容与图纸不一致、变更管理不到位等问题。
	产出时效（3分）	项目实施进度管控有效性	3.00	评价要点：核查已完工项目是否按文件或计划时限完工，延期项目需有合理原因。 A.全部按计划完工，得3分； B.未按计划完工占比不超过15%，得2.5分； C.未按计划完工占比15%至30%，延期项目有合理原因，得2分； D.未按计划完工占比30%至50%，延期项目有合理原因，得1.5分； E.未按计划完工占比50%至70%，延期项目有合理原因，得1分； F.未按计划完工项目占比超过70%，延期缺乏合理原因，得0分。	1.00	产业振兴项目由多个子项目构成，实施周期长，各子项目推进节奏差异明显。桃城镇洋上村、一都镇美岭村、呈祥乡呈祥村、玉斗镇白珩村等产业振兴示范村项目，部分子项目受土地审批、用地性质限制等因素停滞，部分处于在建或招标阶段，整体推进缓慢。一事一议项目同样存在部分项目未开工、暂未实施问题，部分项目因土地征迁、施工方时序安排等原因未能按期动工。对照各批次项目批复工期要求，项目延期情况较为普遍，统计142个项目中94个项目未按批复时限完工，延期项目占比66.20%。项目推进受自筹资金筹措、群众协调、雨季、征地等客观条件制约，同时项目实施进度管控力度不足，未能及时预判化解阻滞因素，项目进度管控成效有待提升。
	产出成本（3分）	项目成本支付管控	3.00	评分要点：核查项目是否超出计价依据支付款项。 A.全部项目均未超出计价依据支付，得3分； B.超出计价依据支付的项目占	3.00	本次评价采取抽样方式，查阅抽样项目的合同、工程量验收资料、结算确认文件、资金支付凭证等材料，核查项目实际支付款项是否超出已确认计价依据总额。经对样本项目逐一核实，抽样范围内项目实际支付金额均未突破对

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
				比不超过 5%，得 2 分； C. 超出计价依据支付的项目占比 5%至 10%，得 1 分； D. 超出计价依据支付的项目占比超过 10%，得 0 分。		应的计价依据上限，未发现超计价依据支付、无依据多付资金等问题，项目成本支付管控总体合规。
项目效益（37 分）	社会效益（20 分）	基础设施服务保障能力	12.00	评分要点：反映道路、沟渠、照明等基础设施建成后，改善群众基础生产生活保障条件，提升区域基础配套保障水平的成效。 对应项目：路面硬化、路灯安装、沟渠修复等工程。 A. 项目投用后基础配套保障水平高，显著改善群众基础生产生活保障条件，得 12 分； B. 整体改善基础生产生活保障条件，≤5%项目提升效果一般，得 10-11 分； C. ＞5%且≤15%项目对基础生产生活保障条件改善有限，得 8-9 分； D. ＞15%且≤25%项目改善效果较差，得 5-6 分； E. ＞25%且≤35%项目未有效提升基础配套保障条件，得 2-3 分； F. ＞35%项目未有效提升基础配	11.00	本项目涵盖村内道路硬化、乡村亮化、人居环境整治、公共场地改造等村级民生工程，有效完善乡村基础设施配套，提升村庄通行能力、夜间照明水平和人居环境质量，夯实乡村公共服务保障基础。根据镇村工作人员问卷（248 份有效样本），87.9%受访者认为有效改善村民出行条件，74.6%认为提升村庄夜间照明，65.32%认为村容人居环境明显改观，45.16%认为新增公共活动场地，仅 7.26%认为改善效果有限。村民问卷（181 份有效样本）显示，83.98%认可道路通行改善、86.74%认为夜间出行更为安全、60.22%认可新增公共活动空间，仅 4.42%未感受到便民成效。 现场核查发现极少数项目建设标准适配性不足，如湖洋镇玉柱村避灾点购置桌椅配置标准偏高，与应急安置场所简约实用的功能定位不匹配。整体来看，项目综合社会效益良好，存在效益短板的项目占比偏低。但受后期管护薄弱、项目进度滞后、个别项目运维及用途管控不到位等因素影响，部分设施未能持续充分发挥公益服务效能，项目综合效益仍有提升空

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
				套保障条件，得0分。		间。
		公共活动供给改善效果	4.00	评分要点：反映村级公共活动场地建设完善后，给村民提供活动空间、丰富公共文化生活的成效。 对应项目：休闲步道、沿溪步道、文化书屋、健身公园、文化广场、避灾安置点等建设项目。 A.场地总体可正常对外开放，全部投入使用，得4分； B.整体可用，≤5%场地极少数频次闲置，得3分； C.＞5%且≤15%项目场地利用率偏低，得2分； D.＞15%且≤30%场地闲置，使用频次低，得1分； E.＞30%较多场地闲置无法使用，得0分。	3.00	本批次公共服务类项目聚焦村级文体休闲场地提质升级，通过场地改造、功能完善，有效拓展乡村公共活动空间，丰富村民文体活动载体，持续健全村级公共服务配套体系。问卷调查显示，45.16%的镇村工作人员认可项目新增公共活动场地的建设成效，60.22%村民反馈村内公共休闲活动场地得到有效补充，公共服务配套改善成效总体良好。 现场核查发现，少数公共服务项目后期运营管护薄弱、公益效益发挥不足。其中东平镇太平村文化书屋改造项目验收后长期空置，未配套设施、未对外开放，场地资源闲置浪费，未实现公共文化服务预期功能；湖洋镇桃美村角落公园建成后管护缺位，场地杂草丛生、设施退化，休闲服务功能受限。同时，部分项目存在建设进度滞后、推进缓慢、个别项目未落地或用途调整等问题，一定程度上影响公共服务供给质量，制约项目整体社会效益充分释放。总体来看，存在效益短板的项目占比较低，项目公共服务提升整体成效良好。
		群众需求匹配及普惠覆盖程度	4.00	评分要点：评价项目建设内容与村民实际需求契合程度，以及项目惠及村民群体的普惠范围。 对应项目：全部一事一议公益类项目。	3.00	本项目覆盖涉及农业人口771,264人、农业劳动力483,355人，项目整体聚焦村民出行、休闲、便民服务等民生需求，普惠覆盖面广、公益性较强。问卷调查显示，181名受访村民中87.29%认为项目建设非常贴合本村实际需求，

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
				A.项目总体契合群众需求，惠及面广，得4分； B.大多符合群众需求，≤5%项目存在少量不匹配，得3分； C.＞5%且≤15%项目兼顾不足、受益有限，得2分； D.＞15%且≤30%项目建设内容与群众需求存在偏差，得1分； E.＞30%项目脱离群众实际需求，得0分。		11.05%认为比较符合，整体群众匹配度、需求契合度较高。 但现场核查发现，少数项目实际使用功能与立项服务定位存在偏差，建设目标与群众需求匹配不足。东平镇霞林村便民中心功能室、老人健身功能室及湖洋镇玉柱村老人活动中心修缮项目，立项定位为便民服务、老年活动、健身休闲等公益用途，实际建成后主要用作村级会议会务场所，部分项目未按规划配置健身设施，项目功能偏离立项初衷，老年群体便民公益服务绩效未能有效落地。 总体而言，本批次项目整体贴合村民生产生活诉求，公共服务普惠成效良好，仅极少数项目存在建设用途、功能定位与立项目标不一致的问题。
	产业振兴项目经济效益（8分）	村集体经济增收情况	6.00	评分要点：考核产业项目实施后村集体经济增收成效，核查项目运营、租金等集体收益实现情况。 对应项目：产业振兴项目。 A.全部子项目实现增收目标，得6分； B.≤15%子项目未达增收预期，其余实现增收，得5-5.5分； C.＞15%且≤40%子项目未达增收预期，得4-4.5分；	3.30	本指标专项考核产业振兴项目实施后的村集体经济增收成效，重点核查经营性项目运营、租金收益等增收落地情况。本次共评价13个经营性子项目，其中6个项目未达到增收预期，未达标占比46.15%。 部分已运营项目收益偏低、投入产出不匹配，桃城镇洋上村仓储展示中心年度租金收益有限，资产效益发挥不足；东平镇太平村公共服务平台农产品项目完工后闲置利用不当，无增收收益；一都镇美岭村人才孵化基地改造后无租赁、运营收益，未赋能村级集体经济发展；

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
				D.＞30%且≤50%子项目未达增收预期，得3-3.5分； E.＞50%子项目无集体增收，预期收益目标未实现，得0分。		呈祥乡呈祥村云山花园提升项目尚未实施，暂无收益。其余石鼓镇卿园村、玉斗镇白珩村部分经营性项目已对外出租，能够稳定产生集体租金收益。 本次参评经营性项目累计已投入资金419.66万元，整体年度租赁收益19.64万元，整体投入产出效益偏弱，近半数项目增收成效未达预期，产业振兴赋能村集体经济增收效果有待进一步提升。
		产业项目辐射带动作用	2.00	评分要点：产业项目对县区村民间接带动效果。 对应项目：产业振兴项目。 A.产业带动作用明显，有效激活本地产业、提供就业或便民服务，得2分； B.带动效果较好，≤15%子项目辐射作用偏弱，得1.5分； C.＞15%且≤30%子项目辐射带动作用有限，得1.2分； D.＞30%且≤50%子项目带动效果弱，产业赋能不足，得1分； E.＞50%且≤65%子项目带动效果弱，产业赋能不足，得0.8分； F.＞65%子项目无实质辐射带动作用，得0分。	1.00	本次村民问卷调查共回收有效问卷181份，64.09%受访者认为产业项目对家庭就业增收帮助较大，19.34%认为略有帮助，仅2.76%认为几乎无帮助，整体群众主观认可度较好，但问卷仅反映主观感受，无法量化实际增收、带动就业规模。 本次共评价14个产业振兴子项目，其中7个子项目辐射带动作用弱或无实质带动效果，占比50%，产业赋能成效不足。部分项目存在收益偏低、项目停滞、功能闲置、用途偏离等问题：桃城镇洋上村部分产业项目收益有限、部分项目停滞，辐射带动不足；东平镇太平村公共服务平台项目闲置误用，未产生产业带动效益；一都镇美岭村人才孵化基地实际用途偏离产业振兴定位，无辐射带动作用；呈祥乡呈祥村项目未落地、在建未投用，暂无带动成效；玉斗镇白珩村多数项目未完工、未投用，现有

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
						项目带动能力偏弱。仅石鼓镇卿园村部分经营性项目运营良好，对本地就业、消费具备一定带动效果。 总体而言，本批次产业项目半数带动成效偏弱，对村民就业增收、地方产业发展的赋能作用未能充分发挥。
	可持续影响效益（5分）	长效管护与项目持续效益	3.00	评分要点：评价项目竣工验收移交投用后，现场管护落实情况与设施持续运行状态。 A. 管护总体落实到位，设施稳定持续运行，得 3 分； B. 管护基本到位，≤5%项目存在极少数轻微短板，得 2.5 分； C. ＞5%且≤15%项目管护不足、维修不及时，得 2 分； D. ＞15%且≤30%项目管护缺失，部分设施闲置，得 1 分； E. ＞30%项目管护缺失，设施大量闲置，得 0 分。	2.50	结合管护人员问卷（有效样本 248 份）、村民问卷（有效样本 181 份）及现场踏勘综合研判：60.89%管护人员反馈无明显运维压力，49.19%反馈管护经费来源不足，15.32%反馈管护人员配置不足，16.94%反馈耗材维护成本较高，12.9%受访者认为群众爱护公共设施意识参差不齐、设施损坏现象较多；90.61%村民观察设施完好可用，少量存在灯具不亮、轻微破损等情况，问题项目占比≤5%，管护基本到位。但整体管护工作面临经费保障压力，近半数管护人员反映管护经费来源不足，后续需拓宽管护资金渠道，保障设施长期稳定运行。
		项目长效管护机制完善性	2.00	评分要点：评价项目长效管护制度建立、责任落实及管护资金保障情况。 A. 管护机制完整落地，管护资金保障到位，得 2 分； B. 管护机制已建立，≤5%项目管护责任存在小瑕疵，得 1.5 分；	2.00	各项目已基本建立对应的长效管护制度，明确由村集体作为管护主体，落实设施日常管护责任。

一级指标（分值）	二级指标（分值）	三级指标	分值	评分标准及说明	得分	评分依据
				C. ＞5%且≤15%项目管护责任未完全落地，得 1 分； D. ＞15%且≤30%项目管护机制不完善，效益持续性不足，得 0.5 分； E. ＞30%项目管护机制缺失，难以长期发挥效益，得 0 分。		
	满意度（4 分）	群众满意度	4.00	评分要点：受益村民对项目实施效果的满意情况。 A. 非常满意，4 分； B. 比较满意，3.2 分； C. 一般，2.4 分； D. 不太满意，0.8 分； E. 不满意，0 分。 计分规则：各评价结果占比乘以对应分值总和。	3.82	本项目村民满意度调查有效样本 181 份，81.22%受访者对项目表示非常满意，14.92%受访者表示比较满意，3.87%受访者评价为一般，无受访者选择不太满意、不满意，综合满意度较高，群众对项目实施成效认可度较好。结合现场核查情况，多数项目能够贴合村民生产生活需求，有效改善村内基础设施条件；少数项目存在功能定位偏差、闲置等问题，但未对整体群众评价形成明显负面影响。
总分			100		80.26	
评价等级				良		
评级标准				分数 S：S≥90 优秀；90＞S≥80 良；80＞S≥60 中；S＜60 差。		

附件 2 评价工作流程

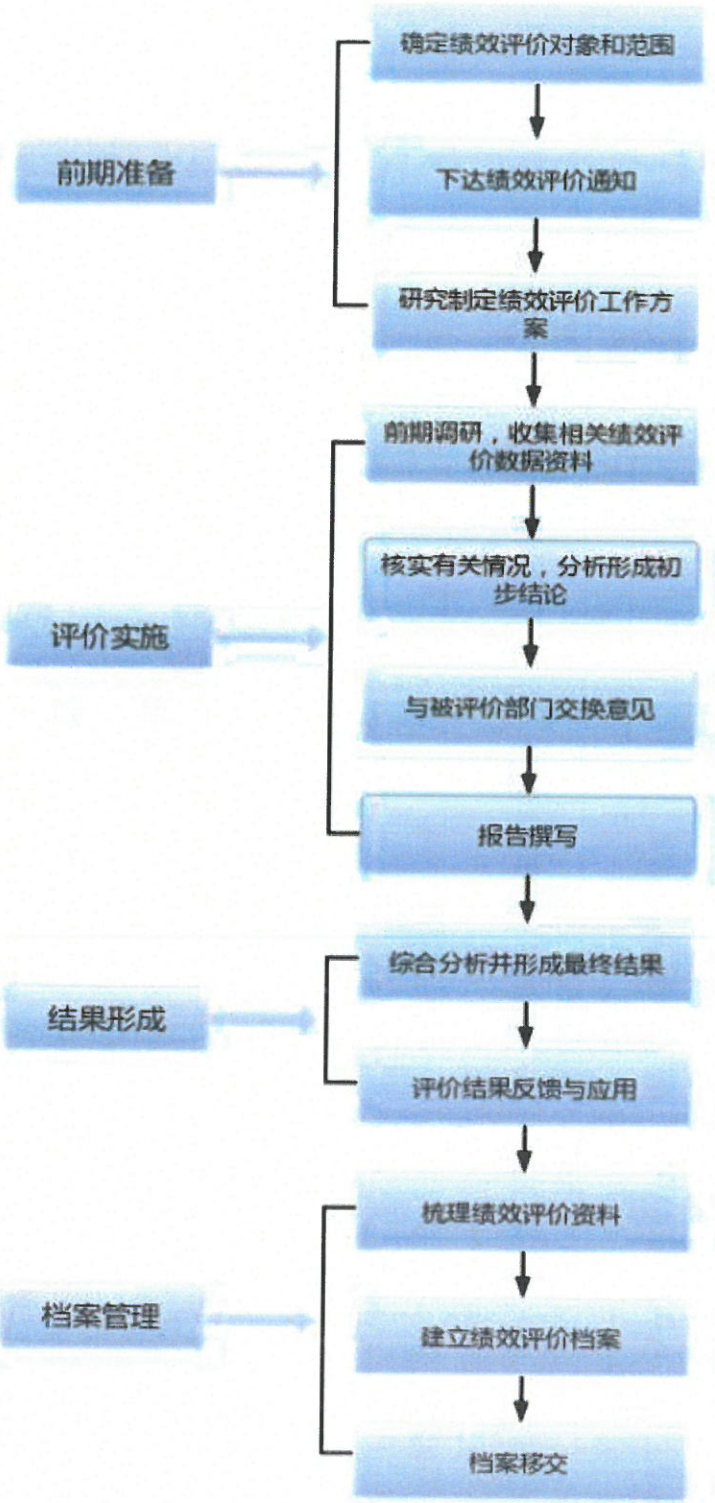
前期准备
确定绩效评价对象和范围
下达绩效评价通知
研究制定绩效评价工作方案
评价实施
前期调研，收集相关绩效评价数据资料
核实有关情况，分析形成初步结论
与被评价部门交换意见
报告撰写
结果形成
综合分析并形成最终结果
评价结果反馈与应用
档案管理
梳理绩效评价资料
建立绩效评价档案
档案移交

附件 3 现场抽查项目清单

序号	项目类别	乡镇	村居	项目名称	合计	县级	省级
1	一事一议	达埔镇	洪步村	永春县达埔镇洪步村方旗圳路口至竹林室路灯亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00
2	一事一议	达埔镇	洪步村	村内亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00
3	一事一议	达埔镇	洪步村	洪步村村内路灯亮化工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00
4	一事一议	达埔镇	洪步村	洪步村村内路灯亮化工程（追加）	80,000.00	16,000.00	64,000.00
5	一事一议	达埔镇	金星村	金星村天磨线排洪防滑坡	150,000.00	30,000.00	120,000.00
6	一事一议	达埔镇	蓬莱村	太阳能路灯改造	100,000.00	20,000.00	80,000.00
7	一事一议	达埔镇	蓬莱村	路灯改造	125,000.00	25,000.00	100,000.00
8	一事一议	达埔镇	蓬莱村	达埔镇蓬莱村太阳能路灯建设项目	200,000.00	40,000.00	160,000.00
9	一事一议	达埔镇	乌石村	村部周边路灯亮化工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00
10	一事一议	达埔镇	乌石村	村部周边路灯亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00
11	一事一议	达埔镇	乌石村	水渠修复与车场硬化	150,000.00	30,000.00	120,000.00
12	一事一议	达埔镇	新溪村	村道硬化	150,000.00	30,000.00	120,000.00
13	一事一议	东平镇	太平村	太平村文化书屋场所提升工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00
14	一事一议	东平镇	太平村	太平村溪滨路休闲健身、硬化项目	250,000.00	50,000.00	200,000.00
15	产业振兴	东平镇	太平村	2024 年产业振兴示范村/2024 年产业振兴配套资金	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
16	一事一议	东平镇	霞林村	霞林村便民中心功能室工程加层及外墙装修	100,000.00	20,000.00	80,000.00
17	一事一议	东平镇	霞林村	霞林村便民中心功能室	30,000.00	6,000.00	24,000.00
18	一事一议	东平镇	霞林村	霞林村老人健身功能室	120,000.00	24,000.00	96,000.00
19	一事一议	湖洋镇	桃美村	上街道角落公园建设	100,000.00	20,000.00	80,000.00
20	一事一议	湖洋镇	桃美村	桃美村老年人活动中心主体建设工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00
21	一事一议	湖洋镇	吴岭村	吴岭村寨子至下罗公路工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00

22	一事一议	湖洋镇	吴岭村	吴岭村道路硬化及绿化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00
23	一事一议	湖洋镇	吴岭村	吴岭村岭头角落道路硬化绿化工程	250,000.00	50,000.00	200,000.00
24	一事一议	湖洋镇	玉柱村	玉柱村老年人活动中心修缮提升工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00
25	一事一议	湖洋镇	玉柱村	玉柱村自然灾害避灾点改造提升工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00
26	一事一议	湖洋镇	玉柱村	玉柱村自然灾害避灾点改造提升	150,000.00	30,000.00	120,000.00
27	一事一议	石鼓镇	洑江村	洑江村下页吉岭角落排洪、灌溉水渠及涵洞桥梁建设工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00
28	一事一议	石鼓镇	卿园村	卿园寨亮化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00
29	一事一议	石鼓镇	卿园村	卿园村寨卿线旁路基塌方修复工程	250,000.00	50,000.00	200,000.00
30	一事一议	石鼓镇	卿园村	卿园村寨卿线旁路基塌方修复工程	250,000.00	50,000.00	200,000.00
31	产业振兴	石鼓镇	卿园村	2024 年产业振兴示范村/2024 年产业振兴配套资金	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
32	一事一议	石鼓镇	桃场社区	桃场社区文昌广场建设工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00
33	产业振兴	一都镇	美岭村	2024 年产业振兴示范村/2024 年产业振兴配套资金	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
34	一事一议	一都镇	吴殊村	产业振兴县配套	500,000.00	500,000.00	-
35	一事一议	一都镇	仙友村	室内灯光运动场项目	200,000.00	40,000.00	160,000.00
36	一事一议	一都镇	仙友村	仙友村篮球场顶棚钢结构项目	200,000.00	40,000.00	160,000.00
37	产业振兴	一都镇	美岭村	2024 年产业振兴示范村/2024 年产业振兴配套资金	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
38	一事一议	呈祥乡	呈祥村	田间路建设（瓦窑头、茂林、福山、苦廊、剧泝）	130,000.00	26,000.00	104,000.00
39	一事一议	呈祥乡	呈祥村	百姓大舞台	100,000.00	20,000.00	80,000.00
40	产业振兴	呈祥乡	呈祥村	2025 年产业振兴示范村	1,500,000.00	-	1,500,000.00
41	一事一议	玉斗镇	白珩村	白珩村达白线道路拓宽与硬化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00
42	产业振兴	玉斗镇	白珩村	2025 年产业振兴示范村	1,500,000.00	-	1,500,000.00
43	一事一议	桃城镇	洋上村	洋上村新坂堂右侧民居修缮工程	180,000.00	36,000.00	144,000.00
44	产业振兴	桃城镇	洋上村	2024 年产业振兴示范村/2024 年产业振兴配套资金	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
45	一事一议	锦斗镇	卓湖村	锦斗镇卓湖村大坪格至 300 米入口新建道路工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00
合计					19,135,000.00	4,127,000.00	15,008,000.00

附件 4 项目建设情况及收益情况

项目类别	项目所在区域		项目名称	子项目名称	项目数量	项目状态			项目年收益
	乡镇	村居				完工	在建	未实施	
总计					294	281	6	7	19.64
一事一议	22 个乡镇	174 个村	一事一议小计		275	268	4	3	-
产业振兴	产业振兴小计				19	13	2	4	19.64
	桃城镇	洋上村	2024 年产业振兴示范村/2024 年产业振兴配套资金	洋上村农产品展销中心	2			1	0.00
				洋上村现代产业农产品仓储及展示中心装修工程		1			2.30
	东平镇	太平村	2024 年产业振兴示范村/2024 年产业振兴配套资金	太平村公共服务平台（农产品）项目	3	1			0.00
				太平村产业振兴综合楼装修工程		1			5.20
				太平村麻笋运营中心提升项目		1			2.58
	一都镇	美岭村	2024 年产业振兴示范村/2024 年产业振兴配套资金	莲花山农村休闲观光旅游项目	3			1	0.00
				美岭人才孵化基地项目		1			0.00
				美岭村丁坂公路白改黑工程		1			-
	石鼓镇	卿园村	2024 年产业振兴示范村/2024 年产业振兴配套资金	不夜城改造提升工程	6	1			2.76
				树下餐厅及庭院修缮工程		1			1.80
				树下餐厅主体建设工程		1			
				千亩蔗园蓄水池改造工程		1			-
				村庄内湾角落果蔗示范园道路硬化及灌溉工程		1			-
				桥头涵洞修缮及排水工程		1			-
	呈祥乡	呈祥村	2025 年产业振兴示范村	云山花园提升改造项目	2			1	0.00
				云山花园提升改造（道路拓宽）工程			1		-
	玉斗镇	白珩村	2025 年产业振兴示范村	白珩村公路停车区充电桩项目（二期）	3	1			5.00
				218.72 千瓦光伏发电采购项目			1		0.00
				仓储中心（名称未确定）				1	0.00

附件 5 村民问卷调查

第 1 题　您所在的乡镇是？　[填空题]

第 2 题　您所在的村（社区）是？　[填空题]

第 3 题　您是否知晓本村实施的农村公益事业建设项目？　[单选题]

选项	小计	比例
清楚了解项目建设内容	155	85.16%
听说过，知道大概	24	13.19%
听说过，知道一点点	2	1.1%
完全不知道	1	0.55%
本题有效填写人次	182	

第 4 题　该项目给日常生活带来哪些实际便利？（可多选）　[多选题]

选项	小计	比例
夜间出行有照明，出行更安全	157	86.74%
通行道路条件得到改善	152	83.98%
新增可供村民使用的公共活动场地	109	60.22%
没有感受到明显便利	8	4.42%
其他：	3	1.66%
本题有效填写人次	181	

第 5 题　根据您日常亲眼观察所见，项目设施是否存在下面情况？（可多选）　[多选题]

选项	小计	比例
设施完好，能够正常使用	164	90.61%
照明设施已安装，但经常不开启、部分灯具不亮	17	9.39%
部分建成的公共配套场所，不对外开放	8	4.42%
部分建成道路通行人数少，使用频次低	8	4.42%
部分设施已经破损，没人修理	4	2.21%

没有出现上面这些问题	53	29.28%
其他情况：	0	0%
本题有效填写人次	181	

第 6 题　您认为项目建设是否符合本村群众的实际需要？　[单选题]

选项	小计	比例
非常符合	158	87.29%
比较符合	20	11.05%
一般	3	1.66%
不太符合	0	0%
完全不符合	0	0%
本题有效填写人次	181	

第 7 题　您对建设项目质量的评价：　[单选题]

选项	小计	比例
很好	150	82.87%
较好	26	14.36%
一般	5	2.76%
较差	0	0%
很差	0	0%
本题有效填写人次	181	

第 8 题　当前项目设施整体状态：　[单选题]

选项	小计	比例
设施完好，可以正常使用	166	91.71%
存在小损坏，但不影响主要使用	14	7.73%
多处损坏，对正常使用造成较大影响	1	0.55%
已经无法正常投入使用	0	0%
本题有效填写人次	181	

第 9 题　您是否见到过相关设施开展维护、修理作业？　[单选题]

选项	小计	比例
经常见到维护作业	118	65.19%
偶尔见到维修	48	26.52%
几乎没有见过	14	7.73%
不清楚	1	0.55%
本题有效填写人次	181	

第 10 题　综合来看，您对本项目的满意程度：　[单选题]

选项	小计	比例
非常满意	147	81.22%
比较满意	27	14.92%
一般	7	3.87%
不太满意	0	0%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	181	

第 11 题　（仅产业振兴项目填写）该项目有没有给您家庭带来就业、收入方面的帮助？[单选题]

选项	小计	比例
帮助比较大	116	64.09%
有一点帮助	35	19.34%
几乎没有帮助	5	2.76%
不清楚	0	0%
不涉及产业振兴项目	25	13.81%
本题有效填写人次	181	

第 12 题　对于本村这类公益项目建设，您有什么意见或建议？　[填空题]

满意、非常好、满意、希望投入资金加强农村道路和路灯建设、很好、要注意以后维修问题、对村民很好、无意见、公路加宽、一般、做好日常维护、方便村民出行、希望多建设公益项目、对村民帮助很大、给群众方便，很好、希望村里能加大投入、提高建设补助资金、多实施这类公益项目、越多越好、没意见、继续开展、非常满意、多一些这类项目建设、公益项目可以多做些、继续完成公益建设、继续保持、希望村“两委”干部继续努力发展乡村振兴工作。

附件 6 乡镇、村工作人员问卷调查

第 1 题　您所在乡镇是？　[填空题]

第 2 题　您所在的村（社区）是？　[填空题]

第 3 题　项目实施阶段，实际遇到的现实困难有哪些？（可多选）　[多选题]

选项	小计	比例
群众诉求协调沟通难度大	64	25.81%
村集体自筹资金筹措压力大	158	63.71%
施工单位配合、现场管理方面问题	34	13.71%
工期受天气、征地占地等客观条件制约	52	20.97%
项目变更调整协调工作量大	35	14.11%
几乎没有遇到明显困难	90	36.29%
其他（请写明）：	1	0.4%
本题有效填写人次	248	

第 4 题　结合项目运维管理实际，本项目设施投入使用后，是否存在下列情况？（可多选）　[多选题]

选项	小计	比例
全部设施正常投入使用，无闲置停用现象	159	64.11%
部分照明设施建成，但存在不开启、灯具损坏问题	19	7.66%
部分公共配套场所建成，但未能对外开放使用	15	6.05%
部分道路建成后通行频次较低	12	4.84%
存在建成后使用频次很低、闲置的情形	8	3.23%
未出现上述现象	100	40.32%
其他现象：	1	0.4%
本题有效填写人次	248	

第 5 题　项目投运后运行层面存在哪些现实问题？（可多选）　[多选题]

选项	小计	比例
设施整体运行稳定，无明显问题	218	87.9%
部分设施易发生损坏，维修不够及时	38	15.32%
设施实际使用频次低于前期预判	18	7.26%
群众对项目存在不同诉求意见	32	12.9%
其他：	2	0.81%
本题有效填写人次	248	

第 6 题　在项目后续运维管护工作上，当前主要现实压力是？（可多选）　[多选题]

选项	小计	比例
无明显压力，可保障设施正常运维	151	60.89%
管护经费来源不足	122	49.19%
管护人员配置不足	38	15.32%
照明类设施电费、耗材维护成本较高	42	16.94%
群众爱护公共设施意识参差不齐，设施损坏现象较多	32	12.9%
其他压力：	0	0%
本题有效填写人次	248	

第 7 题　对比项目申报设定的预期成效，本项目实际落地达成情况：　[单选题]

选项	小计	比例
超出预期，落地成效优于申报设想	50	20.16%
基本达到申报设想效果	176	70.97%
部分成效未能实现，目标存在一定偏差	15	6.05%
实际落地成效与申报设想差距较大	7	2.82%
本题有效填写人次	248	

第 8 题　从项目落地带来的实际改变看，产生的正向作用包含哪些？（可多选）　[多选题]

选项	小计	比例
改善村民出行通行条件	218	87.9%
改善村庄夜间通行照明条件	185	74.6%
新增村民活动公共场地	112	45.16%
改善村庄人居环境面貌	162	65.32%
产业项目带动村集体 / 农户增收（仅产业振兴项目填写）	34	13.71%
产生的实际改善有限	18	7.26%
其他：	0	0%
本题有效填写人次	248	

第 9 题　【产业振兴项目填写】结合项目实际运营情况，本项目在村集体增收、带动农户方面的达成情况：　[单选题]

选项	小计	比例
效果明显，已实现稳定增收、带动农户就业	113	45.56%
具备一定效果，但增收、带动效益尚未达到项目预期目标	58	23.39%
效果有限，暂未产生实质的增收、带动成效	13	5.24%
项目暂未运营，效益尚未显现	4	1.61%
不涉及产业振兴项目	60	24.19%
本题有效填写人次	248	

附件7 2024年-2025年农村公益事业建设项目资金使用及建设情况

文件号	文件名称	项目类别	项目所在区域		项目名称	财政计划奖补资金			村/社区收支最终情况									财政收回指标暂缓下达资金	完工状态	完工时间	验收状态	验收时间	资产状态	结余资金	不予认定支出/备注
			乡镇	村居		合计	县级	省级	收入				支出												
									小计	2024年会年收入	2025年会年收入	截至2025年6月底收入	小计	2024年会年支出	2025年会年支出	截至2026年6月底支出	未支出原因								
		总计				49,062,500.00	10,412,500.00	38,650,000.00	42,642,500.00	1,830,000.00	20,825,000.00	19,987,500.00	84,912,200.15	7,173,512.44	58,540,487.92	19,198,199.79		6,430,000.00	-	-	-	-	-	5,088,455.62	
-	-	一事一议资金合计				38,062,500.00	8,412,500.00	29,650,000.00	36,092,500.00	1,830,000.00	17,725,000.00	17,037,500.00	80,544,342.75	6,427,086.44	55,690,738.52	18,426,517.79		1,470,000.00	-	-	-	-	-	3,235,071.02	

文件号	文件名称	项目类别	项目所在区域		项目名称	财政计划类补资金			村/社区收支总体情况								财政收回指标暂缓下达资金	完工状态	完工时间	验收状态	验收时间	资产状态	结余资金	不予认定支出/备注
			乡镇	村居		合计	县级	省级	收入				支出											
									小计	2024年全年收入	2025年全年收入	截至2026年6月底收入	小计	2024年全年支出	2025年全年支出	截至2026年6月底支出	未支出原因							
		一事一议	桃城镇	智安社区	智安社区老年活动中心建设	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00			331,550.00	331,550.00				-	完工	2024年6月26日	已验收	2024年7月31日	在用	-	
		一事一议	桃城镇	卧龙社区	卧龙社区户外健身场所改造提升建设	130,000.00	26,000.00	104,000.00	130,000.00		130,000.00		165,274.00		165,274.00			-	完工	2024年12月22日	已验收	2024年12月27日	在用	-	
		一事一议	桃城镇	丰山村	丰山村道路拓宽硬化建设	130,000.00	26,000.00	104,000.00	130,000.00		130,000.00		128,120.00		128,120.00			-	完工	2024年9月1日	已验收	2024年9月13日	在用	1,880.00	2025年支出：包含工程款128,120元，设计费3,000元，招标代理费1,357元，预算审核费800元，扣除不予认定金额后，支出金额为128,120元。
		一事一议	桃城镇	洋上村	洋上村新民堂右侧民居修缮工程	180,000.00	36,000.00	144,000.00	180,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00			-	完工	2024年6月30日	已验收	2024年11月21日	在用	-	
		一事一议	岭山镇	塘溪村	塘溪村陈井排水沟工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-		-	完工	2024年2月3日	已验收	2024年3月18日	在用	-	
		一事一议	岭山镇	文溪村	文溪村黄文线（牛路坑一桥经）路段水沟及安保工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	-		-	完工	2024年7月5日	已验收	2024年9月7日	在用	-	
		一事一议	岭山镇	幡溪村	幡溪村青砖路路灯	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	151,586.00	151,586.00	-	-		-	完工	2024年5月21日	已验收	2024年5月28日	在用	-	2024年支出：包含工程款151,586元，结算审核费1,000元，预算费1,000元，控制价800元，设计费3,375元，招标代理费1,222元，扣除不予认定金额后，支出金额为151,586元。
		一事一议	仙夹镇	龙湖村	龙湖村路灯增补及修复工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2024年8月1日	已验收	2024年8月2日	在用	-	
		一事一议	仙夹镇	夹际村	夹际村田间横至通塘铁路沿路面整铺白改黑工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00			-	完工	2024年6月22日	已验收	2024年6月28日	在用	-	
		一事一议	仙夹镇	龙美村	龙美村环村路老化工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00			-	完工	2024年6月14日	已验收	2024年8月27日	在用	-	
		一事一议	东平镇	大平村	大平村文化水厝场所提升工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000.00		216,421.00		216,421.00			-	完工	2024年8月27日	已验收	2024年8月29日	在用	-	2025年支出：包含预算费1,855元，招标代理费4,035元，预算审核费1,946元，工程款216,421元，扣除不予认定金额后，支出金额为216,421元。
		一事一议	东平镇	文峰村	文峰村幸福小区排水沟加盖及污水盖修复工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		107,222.00		104,005.00	3,217.00		-	完工	2024年7月31日	已验收	2024年8月12日	在用	-	
		一事一议	东平镇	大山村	大山村中洋溪仙峰支流挡土墙工程	137,500.00	27,500.00	110,000.00	137,500.00		137,500.00		136,576.00		136,576.00			-	完工	2024年6月20日	已验收	2024年8月16日	在用	-	2024年支出：包含征地及青苗补偿20,850.26元；2025年支出：包含工程款136,576元，设计费3,750元，预算费800元，预算审核费800元，招标代理费1,413元，结算审核费800元，监理费3,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为136,576元。
		一事一议	东平镇	霞林村	霞林村便民中心功能室工程加层及外墙装修	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		150,000.00		150,000.00			-	完工		已验收		在用	-	
		一事一议	东关镇	东华社区	东华社区过渡民彩绘建设工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		101,472.00		50,000.00	51,472.00		-	完工	2024年10月28日	已验收	2024年11月15日	在用	-	
		一事一议	东关镇	美升村	美升村路段及周边太阳能路灯亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2024年8月9日	已验收	2024年10月10日	在用	-	
		一事一议	东关镇	东美村	产业路灯及彩叠	500,000.00	500,000.00	-	-									500,000.00	完工	2025年8月16日	已验收	2025年9月5日	闲置	-	项目还未完成，还未申请县级补助资金。
		一事一议	东关镇	溪南村	溪南村路段太阳能路灯建设及改造工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00			-	完工	2024年10月29日	已验收	2024年12月5日	在用	-	
		一事一议	测洋镇	龙山村	龙山村碗碟建路亮化共化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2024年12月10日	已验收	2025年1月10日	在用	-	
		一事一议	测洋镇	白云村	白云村洋岸到尾拦水大坝工程 变更后：白云村公共路灯整改工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2025年5月21日	已验收	2025年7月14日	在用	-	
		一事一议	测洋镇	锦凤村	锦凤村及镇区路灯亮化改造提升工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00			905,600.00	439,200.00	13,600.00	452,800.00		-	完工	2024年9月24日	已验收	2024年10月18日	在用	-	
		一事一议	测洋镇	清白村	清白村新龙地角落通村道路硬化工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00		150,000.00		306,290.00		153,145.00	153,145.00		-	完工	2024年8月15日	已验收	2024年11月27日	在用	-	
		一事一议	测洋镇	玉柱村	玉柱村老年人活动中心修缮提升工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000.00		199,683.00	122,987.00	76,696.00			-	完工	2024年8月19日	已验收	2024年10月12日	在用	317.00	
		一事一议	外山乡	幡溪村	外山乡马爷线幡溪路段路灯亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		121,522.00		121,522.00			-	完工	2024年10月8日	已验收	2024年11月26日	在用	-	
		一事一议	外山乡	革洋村	钱洋水库修复工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000.00		202,984.00			202,984.00		-	完工	2024年12月18日	已验收	2024年12月24日	在用	-	
		小计				12,037,500.00	3,327,500.00	9,310,000.00	12,137,500.00	1,630,000.00	10,307,500.00	200,000.00	15,551,365.60	3,612,182.50	10,785,974.68	1,153,228.42		500,000.00	-	-	-	-	310,525.00	
	永春县财政局关于2024年第二批村级公益事业建设财政补助建设项目的批复	一事一议	一都镇	苏合村	环村路硬化	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00			100,000.00		-	完工	2025年2月19日	已验收	2025年2月25日	固定资产	-	
		一事一议	横口乡	云贵村	中坡路灯工程建设	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2025年1月1日	已验收	2025年1月5日	在用	-	
		一事一议	横口乡	福联村	道路拓宽硬化	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2024年12月11日	已验收	2024年12月20日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	洋岸村	村内老化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		104,670.00		104,670.00			-	完工	2025年12月1日	已验收	2025年12月12日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	达埔村	村内老化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		120,656.00		120,656.00			-	完工	2025年10月30日	已验收	2025年12月26日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	溪源村	村内老化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00		200,000.00			-	完工	2025年6月18日	已验收	2025年7月2日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	蓬果村	大田路路灯改造	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2024年12月23日	已验收	2025年11月23日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	达中村	下仔角落道路修缮、公路驿站建设	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2024年12月7日	已验收	2024年12月7日	在用	-	
		一事一议	石鼓镇	大鹏村	村内老化工程	125,000.00	25,000.00	100,000.00	125,000.00		125,000.00		126,093.00		122,310.00	3,783.00		-	完工	2025年1月5日	已验收	2025年1月6日	在用	-	
		一事一议	石鼓镇	鹏园村	鹏园道亮化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000.00		215,800.00		215,800.00			-	完工	2025年4月5日	已验收	2025年4月8日	在用	-	
		一事一议	桂洋镇	集洲村	金西线至溪至石门道路硬化变更后：桂洋镇集洲村亮化提升工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2025年4月26日	已验收	2025年4月22日	在用	-	
		一事一议	东关镇	东华社区	护岸及桥梁改造修建	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000.00		100,000.00		50,000.00	50,000.00		-	完工	2025年1月4日	已验收	2025年1月24日	在用	100,000.00	
		一事一议	坑仔口镇	福地村	田边机耕路大池塘路硬化	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000.00		201,869.00		201,869.00			-	完工	2025年1月7日	已验收	2025年1月10日	在用	-	2025年支出：包含工程款201,869元，前期费用8,582元，扣除不予认定金额后，支出金额为201,869元。
		一事一议	呈祥乡	呈祥村	百格大舞台	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00			271,213.00	271,213.00				-	完工	2025年6月20日	已验收	2025年8月4日	在用	-	
		一事一议	坑城镇	外龙村	道路拓宽硬化	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		124,938.00		124,938.00			-	完工	2024年12月28日	已验收	2024年12月30日	在用	-	
		一事一议	测洋镇	桃美村	上饶建角至公园建设	100,000.00	20,000.00	80,000.00										100,000.00	完工		已验收	2025/1/16	在用	-	
		一事一议	测洋镇	湖城村	河岸护建亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	101,290.00			101,290.00		-	完工	2024年12月20日	已验收	2024年12月25日	在用	-	
		小计				2,125,000.00	425,000.00	1,700,000.00	2,025,000.00	100,000.00	1,825,000.00	100,000.00	2,186,529.00	271,213.00	1,640,243.00	255,073.00		100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	
		一事一议	一都镇	鲁山村	鲁山村幸福院提升项目	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2024年8月10日	已验收	2024年8月14日	在用	-	
		一事一议	横口乡	上西坑村	横口乡上西坑村排前桥翻建工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2024年6月20日	已验收	2024年10月18日	在用	-	
		一事一议	五马镇	新坊村	新坊村后溪坑机耕路硬化	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2025年2月19日	已验收	2025年2月28日	在用	-	
		一事一议	锦斗镇	卓湖村	锦斗镇卓湖村大坪格至300米入口新建道路工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		-				村级财力紧张、资金筹集缺口、当期集体资金不足，待资金归集筹措到位	-	完工	2023年11月29日	已验收	2025年1月7日	在用	100,000.00	支出名称为永春县锦斗镇卓湖村X315线至大坪格公路入口路基建设工程，与补助项目名称不一致，2024年支出200,000元，2025年支出140,000元，均不予认定为本项目有效支出。
		一事一议	蓬壶镇	壶南村	壶南村上苏坑四组角落道路硬化及路灯工程	50,000.00	10,000.00	40,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00			-	完工	2025年2月15日	已验收	2025年3月5日	在用	-	
		一事一议	蓬壶镇	仙岭村	仙岭村道路建设工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		237,010.00	100,000.00	100,000.00	37,010.00		-	完工	2024年7月7日	已验收	2024年12月5日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	达德村	达德村路灯改造	167,500.00	33,500.00	134,000.00	167,500.00		167,500.00		170,800.00		170,800.00			-	完工	2024年12月22日	已验收	2024年12月24日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	乌石村	村部周边路灯亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00		100,000.00	-		-	完工	2024年12月26日	已验收	2024年12月26日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	光烈村	光烈村大阶路硬化长约110米，宽3米	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00		120,000.00		123,610.00		123,610.00			-	完工	2024年12月26日	已验收	2024年12月27日	在用	-	支出包含工程款123,610元，招标控制价编制费800元，招标预算编制费800元，设计费2,800元，监理费1,709元，结算审核费800元，招标代理费1,042元，扣除不予认定金额后，支出金额为123,610元。
		一事一议	石鼓镇	凤美村	凤美村道境角落亮化工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00		120,000.00		121,980.00		118,320.00	3,660.00		-	完工	2024年12月28日	已验收	2025年1月10日	在用	-	
		一事一议	石鼓镇	坪岭村	平岭村1至4组太阳能路灯亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		103,329.00		103,329.00			-	完工	2025年1月17日	已验收	2025年1月18日	在用	-	
		一事一议	桂洋镇	壶永村	壶永村山宅公路硬化项目	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	97,500.00			97,500.00	2500元作为质保金，期满后填进行支付	-	完工	2025年5月13日	已验收	2025年5月16日	在用	2,500.00	
		一事一议	下洋镇	上晚村	上晚村御天格桃建工程	110,000.00	22,000.00	88,000.00	110,000.00		110,000.00		120,000.00		120,000.00			-	完工	2024年11月19日	已验收	2024年11月22日	在用	-	2025年支出：包含工程款120,000元，监理费2,500元，扣除不予认定金额后，支出金额为120,000元。

文件号	文件名称	项目类别	项目所在区域		项目名称	财政计划奖补资金			村/社区收支最终情况															
			乡镇	村居		合计	县级	省级	收入				支出				财政收回指标暂缓下达资金	完工状态	完工时间	验收状态	验收时间	资产状态	结余资金	不予认定支出/备注
									小计	2024年全年收入	2025年全年收入	截至2026年6月底收入	小计	2024年全年支出	2025年全年支出	截至2026年6月底支出	未支出原因						
永财农（2024）16号	永泰县财政局关于2024年第三批农村公益事业建设财政奖补建设项目的批复	一事一议	下洋镇	金泰村	金泰村路亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		101,093.00		101,093.00			-	完工	2025年4月1日	已验收	2025年7月8日	在用	-	
		一事一议	下洋镇	长汀村	长汀村路灯亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2025年1月12日	已验收	2025年1月12日	在用	-	2025年支出：包含工程款100,000元，质保金4,320元，结算审核费1,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为100,000元。
		一事一议	下洋镇	油山村	村路灯建设	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		154,106.00			154,106.00		-	完工	2025年1月9日	已验收	2025年2月28日	在用	-	
		一事一议	香塘镇	梨光村	梨光村外委线改新建项目（外委至起墙基次级）	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		-	完工	2025年11月29日	已验收	2026年1月19日	在用	-	
		一事一议	香塘镇	贡岭村	贡岭村大湖加固及堤塘工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00			-	完工	2025年4月10日	已验收	2025年4月15日	在用	-	
		一事一议	东平镇	鸡安村	东平镇鸡安村前洋线至陈顶线亮化工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00		120,000.00		121,800.00		118,146.00	3,654.00		-	完工	2024年7月20日	已验收	2025年1月20日	在用	-	
		一事一议	东平镇	霞林村	霞林村便民中心边路建	30,000.00	6,000.00	24,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00			30,000.00		-	完工		已验收		在用	-	
		一事一议	苏坑镇	鹏里村	鹏里村牛羊头至油头机耕公路硬化	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2024年10月5日	已验收	2024年11月15日	在用	-	
		一事一议	梧城镇	大评村	大评村路灯建设工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		103,500.00		103,500.00			-	完工	2024年12月17日	已验收	2024年12月24日	在用	-	
		一事一议	东关镇	东关村	东关村大阳街路灯亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		102,723.00		102,723.00			-	完工	2024年12月27日	已验收	2025年2月27日	在用	-	
		一事一议	东关镇	金城村	东关镇红冷线中心小学至冷水座密置小区公路改造	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00		120,000.00		120,000.00		120,000.00			-	完工	2024年12月31日	已验收	2025.2.21	在用	-	
		一事一议	介福乡	龙津村	龙津村金树道路亮化工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00		150,000.00		150,000.00		150,000.00			-	完工	2025年1月18日	已验收	2025年1月20日	在用	-	
		一事一议	吴坑乡	东溪村	东溪村太阳街路灯建设工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00	100,000.00			100,370.00	100,370.00				-	完工	2025年4月15日	已验收	2025年5月8日	在用	-	
		一事一议	仙夹镇	龙水村	龙水村祠内至环境提升工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	-				-				因项目建设调整，截至2026年6月底未能申请资金拨付，现办理资金拨付中	200,000.00	完工	2025年5月20日	已验收	2025年5月20日	在用	-	
		一事一议	仙夹镇	德田村	德田村花厝角落至南厝角落路灯亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2024年12月31日	已验收	2025年3月12日	在用	-	
		一事一议	仙夹镇	龙湖村	龙湖村路灯增补及维复工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	70,000.00		70,000.00		70,000.00		69,314.00	686.00		30,000.00	完工	2024年8月1日	已验收	2024年8月2日	在用	-	
		一事一议	五里街镇	国林社区	国林社区文化广场建设项目	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2025年8月17日	已验收	2025年9月1日	在用	-	与2024年第四批国林小区健身场所合为同一个项目。
		一事一议	五里街镇	华岩村	华岩村区7组厚德路建路硬化	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		124,172.00		124,172.00			-	完工	2025年2月22日	已验收	2025年3月10日	在用	-	
		一事一议	嵩山镇	文溪村	文溪村南文线（牛路坑—桥经）路段水沟及密保工程	30,000.00	6,000.00	24,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	35,055.00	-	35,055.00	-		-	完工	2024年7月5日	已验收	2024年9月7日	在用	-	
		一事一议	湖洋镇	溪西村	溪西村仙塔公路端边跨路灯项目	150,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00		240,000.00		120,000.00	120,000.00		30,000.00	完工	2025年1月18日	已验收	2025年1月20日	在用	-	
		一事一议	湖洋镇	吴岭村	吴岭村寨子至下罗公路工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00			-	完工	2025年4月15日	已验收	2025年5月8日	在用	-	
		一事一议	湖洋镇	黄溪村	黄溪村道路硬化亮化绿化项目 变更后：黄溪村溪边路亮化及路基工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00		150,000.00		40,192,932.17	2,223,320.94	37,443,404.84	526,206.39		-	完工	2025年3月7日	已验收	2025年3月11日	在用	-	
		一事一议	竹山乡	坡溪村	坡溪村熟溪桥危桥重建工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00		120,000.00		-					-	完工	2024年9月2日	已验收	2024年9月9日	在用	120,000.00	
		小计				3,987,500.00	797,500.00	3,190,000.00	3,727,500.00	100,000.00	3,327,500.00	300,000.00	43,919,980.17	2,423,690.94	40,323,466.84	1,172,822.39		260,000.00	-	-	-	-	-	222,500.00	
永财农（2025）1号	永泰县财政局关于2024年第四批农村公益事业建设财政奖补建设项目的批复	一事一议	五里街镇	国林社区	国林小区健身场所	125,000.00	25,000.00	100,000.00	125,000.00		125,000.00		141,523.00		141,523.00			-	完工	2025年8月17日	已验收	2025年9月1日	在用	-	与2024年第三批国林社区文化广场建设项目合为同一个项目。
		一事一议	湖洋镇	高坪村	村内及通外道路亮化	125,000.00	25,000.00	100,000.00	125,000.00		125,000.00		125,000.00		-	125,000.00		-	完工	2025年12月16日	已验收	2025年12月19日	在用	-	
		一事一议	锦斗镇	长坑村	村里道路亮化	125,000.00	25,000.00	100,000.00	125,000.00		125,000.00		163,582.00		53,500.00	110,082.00		-	完工	2025年7月13日	已验收	2025年7月15日	在用	-	
		一事一议	苏坑镇	鹏里村	牛边公路路基扩宽及硬化	125,000.00	25,000.00	100,000.00	125,000.00		125,000.00		150,000.00		150,000.00			-	完工	2024年10月5日	已验收	2024年11月15日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	莲果村	路灯改造	125,000.00	25,000.00	100,000.00	125,000.00		125,000.00		125,000.00		125,000.00			-	完工	2024年12月23日	已验收	2025年11月23日	在用	-	
		小计				625,000.00	125,000.00	500,000.00	625,000.00	-	625,000.00	-	705,105.00	-	470,023.00	235,082.00		-	-	-	-	-	-	-	
		一事一议	一都镇	仙夹村	仙夹村篮球场顶棚钢结构项目	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00			200,000.00		-	完工	2025年7月30日	已验收	2025年12月26日	在用	-	
		一事一议	一都镇	黄沙村	黄沙村草坪角落牛头陂至下护电厂道路硬化	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工	2025年12月20日	已验收	2025年12月24日	在用	-	
		一事一议	一都镇	仙阳村	白露寺水钢引水工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	10,000.00			10,000.00		-	完工	2025年11月20日	已验收	2025年12月16日	在用	90,000.00	
		一事一议	一都镇	东三村	东三村太阳路灯建设	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			10,000.00	-	-				-	完工	2026年2月13日	已验收	2026年8月18日	在用	100,000.00	
		一事一议	樟口乡	詹德村	詹德村环村路路面建设	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		-	完工	2025年12月28日	已验收	2026年1月26日	在用	-	
		一事一议	樟口乡	福联村	福联村（胜利厝至船斗堂）道路修复工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工	2025年11月1日	已验收	2025年11月10日	在用	-	
		一事一议	樟口乡	樟中村	水尾雄龙溪溪床整治生态护岸工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工	2025年7月14日	已验收	2025年8月12日	在用	-	
		一事一议	樟口乡	樟溪村	环村路亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工	2025年12月20日	已验收	2025年12月22日	在用	-	
		一事一议	樟口乡	云贵村	老内村路面翻建工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工	2025年12月8日	已验收	2025年12月18日	在用	-	
		一事一议	下洋镇	上镜村	上镜村四格区水泥道路硬化建设	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	195,805.00			195,805.00	质量保证金6056元未到期	-	完工	2025年11月8日	已验收	2025年11月12日	在用	4,195.00	
		一事一议	下洋镇	曲斗村	曲斗村农贸市场桥梁改造提升工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	210,428.00			210,428.00		-	完工	2026年2月2日	已验收	2026年3月7日	在用	-	2026年支出：包含工程款210,428元，设计费16,000元，结算审核费1,000元，监理费3,136元，预算审核费959元，扣除不予认定金额后，支出金额为210,428元。
		一事一议	下洋镇	下洋村	下洋村全民健身运动器材改造提升	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	150,000.00			150,000.00		-	完工	2025年10月30日	已验收	2025年12月25日	在用	-	2026年支出：包含工程款150,000元，招标控制价编制费1,000元，预算编制费1,000元，设计费3,600元，扣除不予认定金额后，支出金额为150,000元。
		一事一议	坑仔口镇	玉西村	坑仔口玉西村路灯改造工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000.00		360,892.00		360,892.00			-	完工	2025年9月14日	已验收	2025年9月22日	在用	-	
		一事一议	坑仔口镇	西坪村	西坪村丙丁美道路硬化工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	125,863.00			125,863.00		-	完工	2025年12月8日	已验收	2025年12月10日	在用	-	2025年支出：包含造价咨询费招标2,000元；2026年支出包含：工程费125,863元，监理服务费1,889元，结算审核1,000元，设计费2,500元，扣除不予认定金额后，支出金额为125,863元。
		一事一议	坑仔口镇	埔地村	埔地村厝光路灯建设	110,000.00	22,000.00	88,000.00	110,000.00			110,000.00	148,717.00			148,717.00		-	完工	2025年12月3日	已验收	2025年12月5日	在用	-	2026年支出：包含工程款146,717元，质保金4,599元，结算审核800元，设计服务费3,000元，预算费800元，扣除不予认定金额后，支出金额为148,717元。
		一事一议	玉斗镇	白前村	白前村达白线道路新复与硬化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	285,158.00		100,000.00	185,158.00		-	完工	2025年12月11日	已验收	2025年12月24日	在用	-	
		一事一议	玉斗镇	竹溪村	竹溪村官林边角落危桥新建工程（追加）	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		-	完工	2025年5月9日	已验收	2025年11月26日	在用	-	
		一事一议	玉斗镇	玉斗村	玉斗村玉新线抗倾路段至格后坟公路硬化项目	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		-	完工	2025年11月4日	已验收	2025年11月12日	在用	-	
		一事一议	桂洋镇	金沙村	金沙村金沙角落危险提升	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工	2025年12月25日	已验收	2025年12月26日	在用	-	
		一事一议	桂洋镇	岐山村	岐山村人居环境整治改造提升	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		-	在建	-	未验收	-	-	-	
		一事一议	桂洋镇	桂洋村	桂洋村人居环境整治改造提升	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	100,000.00			100,000.00	先行支付进度款10万元，于2026年8月20日进行验收，待在近期拨付剩余10万元	-	完工	2025年11月15日	已验收	2026年8月20日	在用	100,000.00	
		一事一议	锦斗镇	锦溪村	锦溪村格后路和锦斗中学厚水泥路重新翻铺	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	166,636.00		124,021.00	42,615.00		-	完工	2025年8月29日	已验收	2025年11月18日	在用	-	
		一事一议	锦斗镇	云路村	云路村养护工程村部至茶山公园建路扩宽	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	300,000.00			300,000.00		-	完工	2026年4月1日	未验收	-	-	-	
		一事一议	锦斗镇	卓湖村	闽格至大坪格道路硬化及安保工程 变更后：卓湖村北靴头公路灾毁修复工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	170,000.00			170,000.00	8月已支付7万元，剩余3%保证金未支付	-	完工	2025年12月3日	已验收	2026年1月12日	在用	-	
		一事一议	盖洋乡	西村村	西村村委旧客水池及道路附属工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000.00		235,173.00		235,173.00			-	完工	2025年12月26日	已验收	2026年1月4日	在用	-	
		一事一议	盖洋乡	东溪村	东溪村角落公路硬化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		101,190.00		101,190.00			-	完工	2025年12月9日	已验收	2025年12月12日	在用	-	

文件号	文件名称	项目类别	项目所在区域		项目名称	财政计划资补资金			村/社区收支总体情况							财政收回指标暂缓下达资金	完工状态	完工时间	验收状态	验收时间	资产状态	结余资金	不予认定支出/备注
			乡镇	村居		合计	县级	省级	收入				支出										
									小计	2024年会年收入	2025年会年收入	截至2026年6月底收入	小计	2024年会年支出	2025年会年支出	截至2026年6月底支出	未支出原因							
永财农（2025）9号	永春县财政局关于2025年第一批农村公益事业建设财政奖补建设项目的批复	一事一议	苏坑镇	蔗山村	蔗山村东山角落公路硬化	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	50,000.00			50,000.00		-	完工	2025年11月22日	已验收	2025年11月24日	在用	150,000.00	
		一事一议	蓬壶镇	蓬溪村	蓬溪村老年协会洋树分会提升工程	110,000.00	22,000.00	88,000.00	110,000.00			110,000.00	150,000.00		100,000.00	50,000.00		-	完工	2025年9月29日	已验收	2025年11月27日	在用	-	
		一事一议	苏坑镇	鹏霄村	虎头山至湖格龙治美化工程	130,000.00	26,000.00	104,000.00	130,000.00			130,000.00	160,000.00			160,000.00		-	完工	2025年11月11日	已验收	2025年11月27日	在用	-	
		一事一议	蓬壶镇	洪中村	蓬壶镇洪中村过洞桥拓宽、高坑段路面翻修及安装防护栏项目	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	-				工程未完工	-	在建	-	-	-	-	120,000.00	
		一事一议	蓬壶镇	西昌村	西昌村老人活动室装修	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		-	完工	2025年11月14日	已验收	2025年12月13日	在用	-	
		一事一议	蓬壶镇	洪山村	洪山村仙洞山九曲路修复工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	116,089.00			116,089.00		-	完工	2025年12月28日	已验收	2025年12月30日	在用	3,911.00	
		一事一议	蓬壶镇	八乡村	八乡村龙坑角落道路硬化	110,000.00	22,000.00	88,000.00	110,000.00			110,000.00	110,000.00			110,000.00		-	完工	2025年11月12日	已验收	2025年12月30日	在用	-	
		一事一议	蓬壶镇	东厝村	东厝村村建美化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	147,835.00			147,835.00	项目结算价152415元预留保证金4580元，结余资金按5万元退回国库	-	完工	2025年12月30日	已验收	2026年1月8日	在用	52,165.00	
		一事一议	蓬壶镇	鹏溪村	鹏溪村文化活动中心项目建设	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	-				工程未完工	-	在建	-	-	-	-	120,000.00	
		一事一议	蓬壶镇	观山村	观山村村部周围及五连大阳能路灯安装	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	121,854.00			121,854.00	项目结算价125623元预留保证金3769元	-	完工	2026年2月3日	已验收	2026年3月1日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	蟹安村	2025年后格水库至下格路灯亮化工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	117,832.00			117,832.00	按合同规定剩余资金留3%作为工程保留金	-	完工	2025年10月29日	已验收	2025年11月5日	在用	2,168.00	
		一事一议	达埔镇	洪步村	洪步村村内路灯亮化工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	200,000.00		200,000.00			-	完工	2025年12月1日	已验收	2025年12月12日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	蓬莱村	达埔镇蓬莱村太阳能路灯建设项目	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	199,996.00			199,996.00	团质保金留留3%的工程款，所以遗留4元未支出，	-	完工	2025年8月26日	已验收	2025年11月23日	在用	4.00	
		一事一议	达埔镇	延寿村	延寿村2025年主干道节能路灯	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		-	完工	2025年11月17日	已验收	2025年11月18日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	汉口村	汉口村215线沿线35盏路灯	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	-				施工中	-	在建	2026年8月31日	未验收	-	-	120,000.00	工程于2025年12月8日开标，中标单位一直未施工，因设计书缺陷，重新设计，并于2026年1月20日再次开标，因灯具要预定，生产时间较长，灯具材料寄出不全又加上多雨天气影响施工。
		一事一议	达埔镇	新溪村	村建硬化	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00		150,000.00	-						-	完工	2025年5月29日	已验收	2025年5月29日	在用	150,000.00	达埔镇新溪村Y85承岱线管锁工程，与县财政局指标文件下达的村建硬化项目名称不一致，Y85承岱线管锁工程中标金额214.49万元，永春县院湖局，县财政局2024年扶持老区建设县财补助资金30.00万元，永春县交通运输局分别转拨2024年第二批、2025年度第一批交通项目市级补助资金8.00万元、33.90万元，从县交通局下达的文件来看，该路段路线编码为Y085350525，属于乡道，与财政指标文件标注的村建属性不一致，该笔15.00万元支出不予认定为本项目市级支出。
		一事一议	达埔镇	岛石村	水果场复与车场硬化	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00		-	150,000.00	152,225.00		-	152,225.00		-	完工	2025年11月1日	已验收	2025年11月28日	在用	-	
		一事一议	介福乡	紫庐村	紫庐村零星角落亮化工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00		-	150,000.00	150,000.00			150,000.00		-	完工	2025年11月5日	已验收	2025年11月10日	在用	-	
		一事一议	介福乡	龙津村	龙津村16组道路硬化	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		-	完工	2025年10月21日	已验收	2025年10月24日	在用	-	
		一事一议	吾峰镇	吾中村	吾中村前仔坑角落道路拓宽硬化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		-	完工	2025年12月18日	已验收	2026年1月27日	在用	-	
		一事一议	吾峰镇	坊民村	吾峰镇坊民村蔗子角落道路硬化	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	98,407.00			98,407.00	质保金3%未付	-	完工	2026年2月8日	已验收	2026年3月5日	在用	1,593.00	
		一事一议	吾峰镇	吾西村	吾西村梅溪线Y065（横山路段）道路拓宽工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00		-	完工	2025年12月7日	已验收	2025年12月18日	在用	-	
		一事一议	石鼓镇	承江村	承江村下宫古岭角落排洪、灌溉水渠及涵洞桥梁建设工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	300,362.00			300,362.00		-	完工	2025年12月18日	已验收	2025年12月30日	在用	-	
		一事一议	石鼓镇	石鼓社区	石鼓社区邮电路段亮化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	216,783.00			216,783.00		-	完工	2025年12月17日	已验收	2025年12月19日	在用	-	
		一事一议	石鼓镇	吾江村	吾江村打铁坑拦水坝及灌溉水渠建设项目	130,000.00	26,000.00	104,000.00	130,000.00			130,000.00	127,303.00			127,303.00	余3%：3938元为质保金	-	完工	2025年12月19日	已验收	2026年1月22日	在用	2,697.00	
		一事一议	石鼓镇	凤美村	南边角落至百果园道路加宽硬化工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	431,535.00		431,535.00			-	完工	2025年9月5日	已验收	2025年10月13日	在用	-	
		一事一议	石鼓镇	东安村	坪尾、冲山、前田角落亮化工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00			150,000.00	169,430.00			169,430.00		-	完工	2025年12月29日	已验收	2026年1月4日	在用	-	
		一事一议	五里街镇	蔗溪村	蔗溪村白石坑道路硬化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		-	完工	2025年10月30日	已验收	2025年11月26日	在用	-	
		一事一议	五里街镇	大羽村	大羽村大际角落生产道路硬化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工	2025年12月18日	已验收	2025年12月25日	在用	-	
		一事一议	五里街镇	华前社区	华前社区4组气排球场提升工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00			150,000.00	257,480.00			257,480.00		-	完工	2025年11月15日	已验收	2025年11月27日	在用	-	
		一事一议	五里街镇	吾东村	吾东村老头角落龙湖桥山路道路硬化工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		-	完工	2025年10月20日	已验收	2025年11月10日	在用	-	
		一事一议	桃城镇	锦凤社区	锦凤社区牛环寨道路硬化建设	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	373,803.00			373,803.00		-	完工	2025年12月6日	已验收	2025年12月26日	在用	-	
		一事一议	桃城镇	甄埔社区	甄埔社区万安小区运动场建设	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	129,723.00			129,723.00		-	完工	2025年10月7日	已验收	2025年11月19日	在用	-	
		一事一议	桃城镇	洛阳村	洛阳村路灯改造工程建设	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	104,643.00			104,643.00		-	完工	2025年11月18日	已验收	2025年12月3日	在用	-	
		一事一议	桃城镇	济川社区	济川社区路灯改造工程建设	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	141,702.00			141,702.00		-	完工	2025年12月30日	已验收	2025年12月31日	在用	-	
		一事一议	桃城镇	外蚶村	外蚶村路灯安装工程建设	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	101,054.80			101,054.80		-	完工	2026年1月11日	已验收	2026年1月12日	在用	18,945.20	2026年支出：包含工程款101,054.80元、设计费3,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为101,054.80元。
		一事一议	桃城镇	丰山村	丰山村别克道路拓宽硬化建设	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	102,467.00		90,000.00	12,467.00		-	完工	2025年10月28日	已验收	2025年11月26日	在用	-	
		一事一议	岵山镇	和林村	施厝线镇下东山至和林加油站及支线路灯亮化改建工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	196,487.00	-	-	196,487.00	结算价202564元，剩余未支付未工程保证金	-	完工	2025年12月5日	已验收	2025年12月6日	在用	3,513.00	
		一事一议	岵山镇	锡下村	锡下村347线公路两侧支线亮化工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	120,400.00	-	-	120,400.00		-	完工	2025年9月8日	已验收	2025年10月18日	在用	-	
		一事一议	岵山镇	龙阁村	龙阁村环村路（郭氏路）修复改造工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	152,900.00	-	152,900.00	-		-	完工	2025年9月29日	已验收	2025年10月28日	在用	-	
		一事一议	仙夹镇	龙美村	龙美村龙美线路灯亮化工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00		-	完工	2025年12月2日	已验收	2025年12月12日	在用	-	
		一事一议	仙夹镇	美幕村	美幕村街建至幕后下许路灯提升工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工	2025年10月29日	已验收	2025年11月11日	在用	-	
		一事一议	仙夹镇	龙湖村	龙湖村停车场	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		-	完工	2025年11月7日	已验收	2025年12月11日	在用	-	
		一事一议	仙夹镇	美际村	美际小学下至龙江桥及学校下至温泉桥亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工	2025年10月17日	已验收	2025年12月12日	在用	-	
		一事一议	东平镇	冷水村	冷水村蔗大线公路工程	110,000.00	22,000.00	88,000.00	-			-	-					110,000.00	完工	2026年8月3日	已验收	2026年8月20日	在用	-	
		一事一议	东平镇	大峰村	申福小区基础设施改造及停车位建设工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	104,235.00			104,235.00		-	完工	2025年12月18日	已验收	2025年12月19日	在用	-	2026年支出：包含预算费800元，预算审核费800元，结算审核费800元，工程款104,235元，扣除不予认定金额后，支出金额为104,235元。

文件号	文件名称	项目类别	项目所在区域		项目名称	财政计划奖补资金			村/社区收支总体情况									财政收回结转暂缓下达资金	完工状态	完工时间	验收状态	验收时间	资产状态	结余资金	不予认定支出/备注
			乡镇	村居		合计	县级	省级	收入				支出												
									小计	2024年全年收入	2025年全年收入	截至2026年6月底收入	小计	2024年全年支出	2025年全年支出	截至2026年6月底支出	未支出原因								
永财农（2025）22号	永春县财政局关于2025年第二批农村公益事业建设财政奖补建设项目的批复	一事一议	东平镇	东山村	东山村新小一牌坂线道路亮化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	230,103.00			230,103.00		-	完工	2025年10月20日	已验收	2025年10月28日	在用	-	2026年支出：包含设计费3,926元，预算费1,046元，预算审核费1,027元，结算审核费950元，监理费3,803元，工程款230,103元，扣除不予认定金额后，支出金额为230,103元。
		一事一议	东平镇	霞林村	霞林村老人健身动能室	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		-	完工	2026年1月12日	已验收	2026年2月10日	在用	-	2026年支出：包含预算费800元，预算审核费800元，监理费3,067元，工程款120,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为120,000元。
		一事一议	东关镇	溪南村	溪南村公共活动场所提升及改造工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工		未验收	-	-	100,000.00	
		一事一议	东关镇	内碧村	内碧村主干道太阳能路灯亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	-			-	网上招投标，由于中标方是外省的公司，还未开具发票，所以未支付	-	完工	2026年2月11日	已验收	2026年2月11日	在用	100,000.00	2026年支出：包含设计费4,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为0元，由于中标方是外省的公司，还未开具发票，所以未支付。
		一事一议	东关镇	东华社区	东华社区边坡治理	100,000.00	20,000.00	80,000.00	-			-	-			-		100,000.00	未实施	-	-	-	-	-	工程已招标完成，施工方因时间问题，还未能开工。
		一事一议	湖洋镇	港白村	港白村太阳能路灯亮化提升工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00		120,000.00		363,680.00	120,000.00	121,840.00	121,840.00		-	完工	2026年1月6日	已验收	2026年4月15日	在用	-	
		一事一议	湖洋镇	湖城村	湖城村太阳能路灯亮化提升工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00		120,000.00		120,000.00		120,000.00			-	完工	2024年12月20日	已验收	2024年12月25日	在用	-	
		一事一议	湖洋镇	铁炎村	铁炎村老年人活动中心主体建设工程 变更后：铁炎村洪炎小区道路硬化建设工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	-			-	工程未施工	-	未实施	-	-	-	-	100,000.00	
		一事一议	湖洋镇	高坪村	太阳能路灯亮化提升工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	-			-	-			-		200,000.00	完工	2025年12月16日	已验收	2025年12月19日	在用	-	
		一事一议	湖洋镇	莲阜村	莲阜村湖港线路灯工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00		120,000.00		120,000.00		120,000.00			-	完工	2026年5月2日	已验收	2026年6月29日	在用	-	
		一事一议	外山乡	福溪村	四角坪期末民水果绿复工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	268,536.00			268,536.00		-	完工	2025年12月9日	已验收	2026年1月5日	在用	-	
		一事一议	外山乡	云峰村	云峰村长者服务中心建设工程	117,500.00	23,500.00	94,000.00	117,500.00			117,500.00	130,000.00			130,000.00		-	完工	2026年3月4日	已验收	2026年3月6日	在用	-	
		小计				11,637,500.00	2,327,500.00	9,310,000.00	11,227,500.00	-	1,480,000.00	9,747,500.00	11,916,726.80	120,000.00	2,257,551.00	9,539,175.80		410,000.00	-	-	-	-	-	1,339,191.20	
		一事一议	一都镇	吴姓村	村道村灯线道路拓宽工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		200,000.00	完工	2026年3月20日	未验收	-	-	-	
		一事一议	一都镇	鲁山村	鲁山村休闲运动场地建设及乡村绿化、亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工	2025年9月10日	已验收	2025年12月3日	在用	-	
		一事一议	一都镇	玉三村	玉三村太阳能路灯建设工程（追加）	50,000.00	10,000.00	40,000.00	50,000.00			50,000.00	-			-		-	完工	2026年2月13日	已验收	2026年8月18日	在用	50,000.00	
		一事一议	横口乡	环峰村	后垅往环山道路硬化工程（700米处至223米处交接）	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		-	完工	2025年12月19日	已验收	2025年12月28日	在用	-	
		一事一议	横口乡	上西坑村	坑尾角落防渡延伸建设工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工	2025年12月20日	已验收	2025年12月25日	在用	-	
		一事一议	下洋镇	长汀村	长汀村路灯提升改造	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		-	完工	2026年1月22日	已验收	2026年1月22日	在用	-	2026年支出：包含工程款200,000元，设计费3,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为200,000元。
		一事一议	抗仔口镇	景山村	景山村水泥尾至中洋角落路灯建设工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	104,173.00			104,173.00		-	完工	2025年12月30日	已验收	2025年12月31日	在用	-	
		一事一议	五斗镇	竹溪村	竹溪村官林边角落危桥新建工程（追加）	80,000.00	16,000.00	64,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		-	完工	2025年5月9日	已验收	2025年11月26日	在用	-	
		一事一议	桂洋镇	茂春村	双叉路到上珠路拓宽工程	110,000.00	22,000.00	88,000.00	110,000.00			110,000.00	-			-	施工方暂未申请支付	-	完工	2026年3月10日	已验收	2026年4月14日	在用	110,000.00	
		一事一议	桂洋镇	文大村	村部至上大公路亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	130,329.00			130,329.00		-	完工	2026年2月4日	已验收	2026年2月5日	在用	-	
		一事一议	桂洋镇	盘古村	盘古村太阳能路灯	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	113,563.00			113,563.00		-	完工	2026年2月11日	已验收	2026年3月5日	在用	-	
		一事一议	桂洋镇	库湖村	库湖村金西线Y135幅车建坡段	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	-			-	暂未验收	-	完工	2026年8月3日	未验收	-	-	100,000.00	
		一事一议	锦斗镇	格脚村	格脚村村口至村部周边亮化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		-	200,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00		-	完工	2026年2月13日	已验收	2026年2月13日	在用	50,000.00	2026年支出：包含工程款150,000元，设计费4,500元，预算审核费1,074元，预算费1,090元，扣除不予认定金额后，支出金额为150,000元。
		一事一议	苏坑镇	莫溪村	莫溪村老年协会洋洲分会提升工程（追加）	90,000.00	18,000.00	72,000.00	90,000.00			90,000.00	50,000.00			50,000.00		-	完工	2025年9月29日	已验收	2025年11月27日	在用	40,000.00	
		一事一议	蓬壶镇	西昌村	西昌村老人活动室装修（追加）	57,500.00	11,500.00	46,000.00	57,500.00			57,500.00	-			-	2026年7月支付老人活动室装修工程款33010元。	-	完工	2025年11月14日	已验收	2025年12月13日	在用	57,500.00	
		一事一议	蓬壶镇	仙岭村	仙岭村枇杷产业道路硬化及路灯亮化	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00			150,000.00	-			-	中标公司未开票	-	完工	2026年6月21日	已验收	2026年8月1日	在用	150,000.00	
		一事一议	达埔镇	金星村	金星村五座线排洪附渠坡	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00			150,000.00	200,000.00		50,000.00	150,000.00		-	完工	2025年8月14日	已验收	2025年8月14日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	洪步村	洪步村村内路灯亮化工程（追加）	80,000.00	16,000.00	64,000.00	80,000.00			80,000.00	200,000.00			200,000.00		-	完工	2025年12月1日	已验收	2025年12月12日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	达德村	达德村文体活动场所	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00			150,000.00	153,395.00			153,395.00		-	完工	2026年1月6日	已验收	2026年2月3日	在用	-	
		一事一议	吾峰镇	吾西村	吾西村梅溪线Y065（横山路段）道路拓宽工程（追加）	50,000.00	10,000.00	40,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		-	完工	2025年12月7日	已验收	2025年12月18日	在用	-	
		一事一议	吾峰镇	溪光村	溪光村2025年亮化提升项目	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工	2025年12月31日	已验收	2026年2月5日	在用	100,000.00	
		一事一议	吾峰镇	老岭村	老岭村太阳能路灯工程	135,000.00	27,000.00	108,000.00	135,000.00			135,000.00	135,000.00			135,000.00		-	完工	2025年12月15日	已验收	2025年12月18日	在用	-	
		一事一议	石鼓镇	卿园村	卿园村寨脚线寺路基塘方修复工程	250,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00			250,000.00	250,000.00			250,000.00		-	完工	2026年3月17日	已验收	2026年3月25日	在用	-	
		一事一议	石鼓镇	桃场社区	桃场社区文昌广场建设工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00			150,000.00	147,670.00			147,670.00	余3%：4568元为质保金	-	完工	2026年1月21日	已验收	2026年1月24日	在用	2,330.00	
		一事一议	石鼓镇	桃联社区	雪本路至严贤大厝道路硬化及排水设施	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	141,914.00			141,914.00		-	完工	2026年1月23日	已验收	2026年1月26日	在用	-	
		一事一议	五里街镇	善边村	洲安角落活动中心后档土墙工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,512.00			100,512.00		-	完工	2026年1月18日	已验收	2026年2月2日	在用	-	
		一事一议	五里街镇	大羽村	大羽村角落生产道路硬化工程（追加）	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工	2025年12月18日	已验收	2025年12月25日	在用	-	
		一事一议	桃城镇	环翠社区	路灯安装改造	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00			150,000.00	150,725.00			150,725.00		-	完工	2026年1月11日	已验收	2026年2月4日	在用	-	
		一事一议	蓬山镇	蓬溪村	蓬溪村田头中路灵芝糖馆路东抽洪钢架化工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	160,063.00	-	-	160,063.00		-	完工	2026年1月13日	已验收	2026年1月29日	在用	-	
		一事一议	蓬山镇	大溪村	大溪大桥美化亮化	125,000.00	25,000.00	100,000.00	125,000.00	-	-	125,000.00	125,008.00	-	-	125,008.00		-	完工	2025年12月28日	已验收	2026年1月6日	在用	-	
		一事一议	东平镇	大山村	大山村文体广场人行道建设及篮球场地修缮工程	140,000.00	28,000.00	112,000.00	140,000.00			140,000.00	210,000.00			210,000.00		-	完工		未验收	-	-	-	2026年支出：包含工程款210,000元，设计费11,777元，预算费1,374元，预算审核费1,356元，扣除不予认定金额后，支出金额为210,000元。
		一事一议	东关镇	宏翔社区	北翔社区中心休闲活动场所建设工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	200,020.00			200,020.00		-	完工	2025年12月19日	已验收	2026年2月10日	在用	-	
		一事一议	东关镇	奥外村	奥外村山后角落太阳能路灯亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00			100,000.00		-	完工	2026年1月10日	已验收	2026年1月10日	在用	-	
		一事一议	东关镇	东美村	东美村桥尾角落太阳能路灯亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	99,272.00			99,272.00	剩余质保金未拨付	-	完工	2026年1月28日	已验收	2026年2月9日	在用	728.00	
		一事一议	湖洋镇	吴岭村	吴岭村道路硬化及绿化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00		-	完工	2026年1月28日	已验收	2026年2月10日	在用	-	
		一事一议	湖洋镇	莲阜村	莲阜村湖港线路灯工程（追加）	30,000.00	6,000.00	24,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00			-	完工	2026年5月2日	已验收	2026年6月29日	在用	-	
		一事一议	湖洋镇	湖城村	湖城村太阳能路灯亮化提升工程（追加）	130,000.00	26,000.00	104,000.00	130,000.00		130,000.00		266,960.00		133,480.00	133,480.00		-	完工	2026年1月9日	已验收	2024年12月25日	在用	-	
		一事一议	湖洋镇	玉柱村	玉柱村自郎灾害减灾点改造提升工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00		-	完工	2026年3月30日	已验收	2026年8月18日	在用	-	

文件号	文件名称	项目类别	项目所在区域		项目名称	财政计划奖补资金			村/社区收支总体情况								财政收回指标暂缺下达资金	完工状态	完工时间	验收状态	验收时间	资产状态	结余资金	不予认定支出/备注
									收入				支出											
			乡镇	村居		合计	县级	省级	小计	2024年全年收入	2025年全年收入	截至2026年6月底收入	小计	2024年全年支出	2025年全年支出	截至2026年6月底支出	未支出原因							
		一事一议	湖洋镇	白云村	白云自然村支建至通往仙洞大路连接线公路工程	110,000.00	22,000.00	88,000.00	110,000.00			110,000.00	80,000.00			80,000.00	未验收结算	-	完工	2026年1月20日	未验收	-	-	30,000.00	
		小计				4,987,500.00	997,500.00	3,990,000.00	4,787,500.00	-	160,000.00	4,627,500.00	4,578,604.00	-	213,480.00	4,365,124.00		200,000.00	-	-	-	-	-	690,558.00	
永财农〔2025〕24号	永泰县财政局关于2025年第三批村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的批复	一事一议	湖洋镇	莫岭村	莫岭村岭头角落道路硬化组化工程	250,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00			250,000.00	250,000.00			250,000.00		-	完工	2026年1月28日	已验收	2026年2月10日	在用	-	
		一事一议	湖洋镇	玉柱村	玉柱村自然灾害避灾点改造提升	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00			150,000.00	127,703.18			127,703.18		-	完工	2026年3月30日	已验收	2026年8月1日	在用	22,296.82	湖洋镇玉柱村自然灾害避灾点改造项目支施申报21,879.98元，宣传栏预算16,816.84元，从避灾安置功能需求来看，该部分工程不属于自然灾害避灾安置的必要配套内容，扣除不予认定金额后，支出金额为277,703.18元。
		一事一议	达埔镇	狮峰村	狮峰村仙池宫至岩峰道路硬化	250,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00			250,000.00	250,000.00			250,000.00		-	完工	2026年4月11日	已验收	2026年5月11日	在用	-	
		一事一议	达埔镇	岩峰村	岩峰村八九组角落排洪、排水及道路硬化	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00			150,000.00	-				工程未开工	-	未实施	-	-	-	-	150,000.00	因需征用土地，预计9月中旬开工，12月完成。
		一事一议	达埔镇	新建村	新建村美塘小区二期二排挡土墙	250,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00			250,000.00	-				8月结算，预计10月份支出	-	完工	2026年2月7日	已验收	2026年2月25日	在用	250,000.00	
		一事一议	东平镇	大平村	大平村溪滨路休闲健身、硬化项目	250,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00			250,000.00	264,942.00			264,942.00		-	完工	2026年1月25日	已验收	2026年2月4日	在用	-	2026年支出：包含溪滨路休闲建设路沿前期平整1,820元，设计费5,000元，预算费1,003元，预算审核费1,000元，结算审核费1,000元，工程款264,942元。溪滨路公园休闲健身警示牌1,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为264,942元。
		一事一议	石鼓镇	鄢园村	鄢园村基鄢线旁路基墙方修复工程	250,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00			250,000.00	450,000.00			450,000.00		-	完工	2026年3月17日	已验收	2026年3月25日	在用	-	
		一事一议	五斗镇	五类村	五类村格后林道路拓宽	187,500.00	37,500.00	150,000.00	187,500.00			187,500.00	187,500.00			187,500.00		-	完工	2025年12月24日	已验收	2026年1月13日	在用	-	
		一事一议	蓬壶镇	涵城村	杜涵线及公共场所路灯改造提升工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00			150,000.00	-				初期内出现部分路灯未能正常使用，7月份已付10万元进度款，调试至能正常使用后再付尾款	-	完工	2025年10月14日	已验收	2025年10月17日	在用	150,000.00	
		一事一议	抗仔口镇	诗元村	诗元村大元园机耕路硬化	175,000.00	35,000.00	140,000.00	175,000.00			175,000.00	175,867.00			175,867.00		-	完工	2026年3月28日	已验收	2026年5月8日	在用	-	2026年支出：包含工程款175,867元，招标控制价1,000元，预算编制1,000元，设计服务费4,500元，结算审核费800元，监理费2,654元，扣除不予认定金额后，支出金额为175,867元。
		小计				2,062,500.00	412,500.00	1,650,000.00	2,062,500.00	-	-	2,062,500.00	1,706,012.18	-	-	1,706,012.18		-	-	-	-	-	-	572,296.82	
-	-	乡村振兴资金合计				11,000,000.00	2,000,000.00	9,000,000.00	6,050,000.00	-	3,100,000.00	2,950,000.00	4,367,857.40	746,426.00	2,849,749.40	771,682.00		4,950,000.00	-	-	-	-	-	1,853,384.60	
闽财农指〔2024〕79号，永财农〔2025〕10号	福建省财政厅关于下达2024年产业振兴村补助资金的通知，关于下达2025年第一批贫村公益事业财政奖补资金的通知	产业振兴	桃城镇	湖上村	2024年产业振兴示范村/2024年产业振兴配套资金	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,050,000.00		1,050,000.00		-					950,000.00	在建	-	-	-	-	1,050,000.00	2026年8月支出现代产业农产品仓储及展示中心装修工程款250,616元。
		产业振兴	东平镇	大平村	2024年产业振兴示范村/2024年产业振兴配套资金	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	1,196,615.40		874,933.40	321,682.00		-	完工	2025年11月10日 2025年6月19日 2025年9月23日	已验收	2025年11月25日 2025年6月30日 2025年10月15日	出租	803,384.60	2025年支出：包含产业振兴综合楼-钛金可制作安装费4,350元，预算费2,100元，预算审核费2135元，工程款250,000元，结算审核费1,653元，工程款114,933.40元；公共服务平台农产品项目-设计费9,600元，项目前期建设整治费15,000元，工程款270,000元，预算费1,711元，预算审核费1,685元；振梦运营中心提升项目-设计费7,000元，预算费1,579元，预算审核费1,651元，工程款240,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为874,933.40元。 2026年支出：包含公共服务平台农产品项目-监理费7,974元，结算审核费1,391元，工程款158,446元；振梦运营中心提升项目-监理费7,552元，结算审核费1,310元，工程款163,236元，扣除不予认定金额后，支出金额为321,682元。
		产业振兴	一都镇	奥岭村	2024年产业振兴示范村/2024年产业振兴配套资金	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1,050,000.00	450,000.00	1,550,000.00		1,100,000.00	450,000.00	2026年7月支付	500,000.00	在建	2026年12月31日	未验收	-	-	-	2026年支出：包含人才孵化基地建设项目-工程款300,000元，前期费用5,000元；莲花山农村休闲观光旅游项目前期费用5,540元；下坑线公路白改黑工程139,460元（只有一事一议结转明细，区分不了支出是工程款还是前期费用）。前期费用10,540元不认定， 莲花山农村休闲观光旅游项目土地报批时间比较长，2026年8月21日开标。
		产业振兴	石鼓镇	鄢园村	2024年产业振兴示范村/2024年产业振兴配套资金	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1,000,000.00	500,000.00	1,621,242.00	746,426.00	874,816.00			500,000.00	完工	2025年12月16日	已验收	2025年12月22日	在用	-	
		小计				8,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	6,050,000.00	-	3,100,000.00	2,950,000.00	4,367,857.40	746,426.00	2,849,749.40	771,682.00		1,950,000.00	-	-	-	-	-	1,853,384.60	
闽财农指〔2025〕74号	福建省财政厅关于下达2025年产业振兴村补助资金的通知	产业振兴	夏狮乡	夏狮村	2025年产业振兴示范村	1,500,000.00		1,500,000.00	-			-	-					1,500,000.00	在建	-	-	-	-	-	
		产业振兴	玉斗镇	白鹤村	2025年产业振兴示范村	1,500,000.00		1,500,000.00	-			-	-				截至2026年6月底尚未收到该笔财政资金，2026年8月收到30万元；	1,500,000.00	在建	-	未验收	-	-	-	
		小计				3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	

附件8 不予认定支出明细

序号	项目类别	项目所在区域		项目名称	财政计划奖补资金			村/社区收支总体情况								结余资金	不认定金额	备注
								收入				支出						
		乡镇	村居		合计	县级	省级	小计	2024年全年收入	2025年全年收入	截至2026年6月底收入	小计	2024年全年支出	2025年全年支出	截至2026年6月底支出			
合计					8,132,500.00	1,826,500.00	6,306,000.00	7,632,500.00	150,000.00	2,847,500.00	4,635,000.00	6,968,286.38	151,586.00	3,726,105.40	3,090,594.98	1,354,678.62	975,196.21	
1	一事一议	一都镇	黄田村	大阳能路灯工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		91,828.00		91,828.00		8,172.00	8,172.00	2025年支出：包含路灯服务费、监理费、造价费8,172元，工程款91,828元，扣除不予认定后，支出金额为91,828元。3%质保金未支付。
2	一事一议	下洋镇	曲斗村	曲斗村曲斗新街人居环境改造提升工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		172,498.00		172,498.00		-	10,051.13	2025年支出：包含工程款172,498元、招标控制价编制费800元、预算编制费800元、招标代理费1,780元、监理费2,671.13元、设计费3,000元、结算审核费1,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为172,498元。
3	一事一议	下洋镇	溪塔村	溪塔村水尾休闲步道建设工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		200,000.00		200,000.00		-	8,805.00	2025年支出：包含工程款200,000元、设计费3,600元、招标控制价编制费1,221元、招标代理费2,734元、预算编制费1,250元，扣除不予认定金额后，支出金额为200,000元。
4	一事一议	坑仔口镇	玉西村	玉西村尾庵两侧沿溪步道工程	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00		150,000.00		260,250.00		260,250.00		-	33,598.00	2025年支出：包含工程款260,250元 、前期费用33,598元，扣除不予认定金额后，支出金额为260,250元。
5	一事一议	坑仔口镇	西坪村	西坪村寨头角落路硬化	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		-				100,000.00		支出项目备案表名称为永春县坑仔口镇西坪村西洲线道路硬化工程，与补助项目不一致，2025年支出的119,300元，不予认定为本项目有效支出。
6	一事一议	桃城镇	丰山村	丰山村道路拓宽硬化建设	130,000.00	26,000.00	104,000.00	130,000.00		130,000.00		128,120.00		128,120.00		1,880.00	5,157.00	2025年支出：包含工程款128,120元、设计费3,000元、招标代理费1,357元、预算费800元，扣除不予认定金额后，支出金额为128,120元。
7	一事一议	蛤山镇	蟠溪村	蟠溪村青砖路路灯	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	151,586.00	151,586.00	-	-	-	7,397.00	2024年支出：包含工程款151,586元、结算审核费1,000元、预算费1,000元、控制价800元、设计费3,375元、招标代理费1,222元，扣除不予认定金额后，支出金额为151,586元。
8	一事一议	东平镇	大平村	大平村文化书屋场所提升工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000.00		216,421.00		216,421.00		-	7,836.00	2025年支出：包含预算费1,855元，招标代理费4,035元，预算审核费1,946元，工程款216,421元，扣除不予认定金额后，支出金额为216,421元。
9	一事一议	东平镇	大山村	大山村中洋溪仙峰支流挡土墙工程	137,500.00	27,500.00	110,000.00	137,500.00		137,500.00		136,576.00		136,576.00		-	167,989.26	2024年支出：包含征地及青苗补偿20,850.26元；2025年支出：包含工程款136,576元、设计费3,750元，预算费800元，预算审核费800元，招标代理费1,413元，结算审核费800元，监理费3,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为136,576元。
10	一事一议	坑仔口镇	福地村	田治机耕路大池塘路硬化	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		200,000.00		201,869.00		201,869.00		-	8,582.00	2025年支出：包含工程款201,869元、前期费用8,582元，扣除不予认定金额后，支出金额为201,869元。
11	一事一议	锦斗镇	卓湖村	锦斗镇卓湖村大坪格至300米入口新建道路工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		-				100,000.00	340,000.00	支出项目名称为永春县锦斗镇卓湖村X315线至大坪格公路入口路基建设工程，与补助项目名称不一致，2024年支出200,000元、2025年支出140,000元，均不予认定为本项目有效支出。
12	一事一议	达埔镇	光烈村	光烈村大阶路硬化长约110米，宽3米	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00		120,000.00		123,610.00		123,610.00		-	8,011.00	支出包含工程款123,610元、招标控制价编制费800元、招标预算编制费800元、设计费2,800元、监理费1,769元、结算审核费800元、招标代理费1,042元，扣除不予认定金额后，支出金额为123,610元。
13	一事一议	下洋镇	上魏村	上魏村顿头格栈道工程	110,000.00	22,000.00	88,000.00	110,000.00		110,000.00		120,000.00		120,000.00		-	2,500.00	2025年支出：包含工程款120,000元、监理费2,500元，扣除不予认定金额后，支出金额为120,000元。
14	一事一议	下洋镇	长汀村	长汀村路灯亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00		100,000.00		-	5,320.00	2025年支出：包含工程款100,000元、质保金4,320元、结算审核费1,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为100,000元。
15	一事一议	下洋镇	曲斗村	曲斗村农贸市场桥梁改造提升工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	210,428.00			210,428.00	-	21,095.00	2026年支出：包含工程款210,428元、设计费16,000元、结算审核费1,000元、监理费3,136元、预算审核费959元，扣除不予认定金额后，支出金额为210,428元。
16	一事一议	下洋镇	下洋村	下洋村全民健身运动器材改造提升	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	150,000.00			150,000.00	-	5,600.00	2026年支出：包含工程款150,000元、招标控制价编制费1,000元，预算编制费1,000元、设计费3,600元，扣除不予认定金额后，支出金额为150,000元。
17	一事一议	坑仔口镇	西坪村	西坪村丙丁其道路硬化工程	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	125,863.00			125,863.00	-	7,389.00	2025年支出：包含造价咨询费招标2,000元；2026年支出包含：工程款125,863元、监理服务费1,889元、结算审核1,000元、设计费2,500元，扣除不予认定金额后，支出金额为125,863元。
18	一事一议	坑仔口镇	福地村	福地村殿宪路灯建设	110,000.00	22,000.00	88,000.00	110,000.00			110,000.00	148,717.00			148,717.00	-	9,199.00	2026年支出：包含工程款148,717元、质保金4,599元、结算审核800元、设计服务费3,000元、预算费800元，扣除不予认定金额后，支出金额为148,717元。
19	一事一议	达埔镇	新溪村	村道硬化	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00		150,000.00		-				150,000.00	150,000.00	达埔镇新溪村Y85承岱线晋级工程，与县财政局指标文件下达的村道硬化项目名称不一致。Y85承岱线晋级工程中标金额214.49万元，永春县民政局、县财政局2024年扶持老区建设县级补助资金30万元，永春县交通运输局分别转拨2024年第二批、2025年度第一批交通项目市级补助资金8.00万元、33.90万元。从县交通局下达的文件来看，该路段路线编码为Y085350525，属于乡道，与财政指标文件标注的村道属性不一致，该笔150,000元支出不予认定为本项目有效支出。
20	一事一议	桃城镇	外蚯村	外蚯村路灯安装工程建设	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	101,054.80			101,054.80	18,945.20	3,000.00	2026年支出：包含工程款101,054.80元、设计费3,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为101,054.80元。

序号	项目类别	项目所在区域		项目名称	财政计划奖补资金			村/社区收支总体情况								结余资金	不认定金额	备注
								收入				支出						
		乡镇	村居		合计	县级	省级	小计	2024年全年收入	2025年全年收入	截至2026年6月底收入	小计	2024年全年支出	2025年全年支出	截至2026年6月底支出			
21	一事一议	东平镇	文峰村	幸福小区基础设施改造及停车位建设工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	104,235.00			104,235.00	-	1,600.00	2026年支出：包含预算费800元，预算审核费800元，结算审核费800元，工程款104,235元，扣除不予认定金额后，支出金额为104,235元。
22	一事一议	东平镇	东山村	东山村新小-牌提线道路亮化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	230,103.00			230,103.00	-	10,752.00	2026年支出：包含设计费3,926元，预算费1,046元，预算审核费1,027元，结算审核费950元、监理费3,803元、工程款230,103元，扣除不予认定金额后，支出金额为230,103元。
23	一事一议	东平镇	霞林村	霞林村老人健身功能室	120,000.00	24,000.00	96,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	-	4,667.00	2026年支出：包含预算费800元，预算审核费800元，监理费3,067元，工程款120,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为120,000元。
24	一事一议	东关镇	内碧村	内碧村主干道太阳能路灯亮化工程	100,000.00	20,000.00	80,000.00	100,000.00			100,000.00	-			-	100,000.00	4,000.00	2026年支出：包含设计费4,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为0元。由于中标方是外省的公司，还未开具发票，所以未支付。
25	一事一议	下洋镇	长汀村	长汀村路灯提升改造	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00			200,000.00	-	3,000.00	2026年支出：包含工程款200,000元、设计费3,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为200,000元。
26	一事一议	锦斗镇	珍卿村	珍卿村村口至村部周边亮化工程	200,000.00	40,000.00	160,000.00	200,000.00		-	200,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	50,000.00	6,664.00	2026年支出：包含工程款150,000元、设计费4,500元、预算审核费1,074元、预算费1,090元，扣除不予认定金额后，支出金额为150,000元。
27	一事一议	东平镇	大山村	大山村文体广场人行道建设及篮球场地修缮工程	140,000.00	28,000.00	112,000.00	140,000.00			140,000.00	210,000.00			210,000.00	-	14,507.00	2026年支出：包含工程款210,000元、设计费11,777元、预算费1,374元、预算审核费1,356元，扣除不予认定金额后，支出金额为210,000元。
28	一事一议	湖洋镇	玉柱村	玉柱村自然灾害避灾点改造提升	150,000.00	30,000.00	120,000.00	150,000.00			150,000.00	127,703.18			127,703.18	22,296.82	22,296.82	湖洋镇玉柱村自然灾害避灾点改造项目实施停车棚21,879.98元、宣传栏防雨板416.84元，从避灾安置功能需求来看，该部分工程不属于自然灾害避灾安置的必要配套内容，扣除不予认定金额后，支出金额为277,703.18元。
29	一事一议	东平镇	太平村	太平村溪滨路休闲健身、硬化项目	250,000.00	50,000.00	200,000.00	250,000.00			250,000.00	264,942.00			264,942.00	-	10,823.00	2026年支出：包含溪滨路休闲建设路径前期平整1,820元，设计费5,000元，预算费1,003元，预算审核费1,000元，结算审核费1,000元，工程款264,942元、溪滨路公园休闲健身警示牌1,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为264,942元。
30	一事一议	坑仔口镇	诗元村	诗元村大元园机耕路硬化	175,000.00	35,000.00	140,000.00	175,000.00			175,000.00	175,867.00			175,867.00	-	9,954.00	2026年支出：包含工程款175,867元、招标控制价1,000元，预算编制1,000元、设计服务费4,500元、结算审核费800元、监理费2,654元，扣除不予认定金额后，支出金额为175,867元。
31	产业振兴	东平镇	太平村	2024年产业振兴示范村/2024年产业振兴配套资金	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	1,196,615.40		874,933.40	321,682.00	803,384.60	66,691.00	2025年支出：包含产业振兴综合楼-钛金字制作安装费4,350元，预算费2,100元，预算审核费2135元，工程款250,000元、结算审核费1,653元，工程款114,933.40元；公共服务平台农产品项目-设计费9,600元，项目前期清运整治费15,000元，工程款270,000元，预算费1,711元，预算审核费1,685元；麻笋运营中心提升项目-设计费7,000元，预算费1,579元，预算审核费1,651元，工程款240,000元，扣除不予认定金额后，支出金额为874,933.40元。 2026年支出：包含公共服务平台农产品项目-监理费7,974元，结算审核费1,391元，工程款158,446元；麻笋运营中心提升项目-监理费7,552元，结算审核费1,310元，工程款163,236元，扣除不予认定金额后，支出金额为321,682元。
32	产业振兴	一都镇	美岭村	2024年产业振兴示范村/2024年产业振兴配套资金	2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		1,050,000.00	450,000.00	1,550,000.00		1,100,000.00	450,000.00	-	10,540.00	2026年支出：包含人才孵化基地建设项目-工程款300,000元、前期费用5,000元；莲花山农村休闲观光旅游项目前期费用5,540元；丁坂线公路白改黑工程139,460元（只有一事一议结转明细，区分不了支出是工程款还是前期费用），前期费用10,540元不认定。

附件9　2024年-2025年农村公益事业建设项目收支及实施情况（按乡镇统计）

序号	乡镇	文件补助资金	总收入	总支出	剩余资金	项目状态			
						总计	完工	未实施	在建
1	呈祥乡	2,330,000.00	830,000.00	1,170,796.50	-	7	6		1
2	达埔镇	4,022,500.00	4,022,500.00	4,098,914.00	672,172.00	28	26	1	1
3	东关镇	2,120,000.00	1,520,000.00	1,223,487.00	300,728.00	13	12	1	
4	东平镇	3,607,500.00	3,497,500.00	2,887,914.40	803,384.60	13	13		
5	桂洋镇	1,410,000.00	1,410,000.00	955,014.00	512,500.00	12	11		1
6	横口乡	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-	15	15		
7	湖洋镇	3,055,000.00	2,825,000.00	44,180,428.35	152,613.82	23	22	1	
8	岵山镇	1,245,000.00	1,245,000.00	1,291,499.00	3,513.00	9	9		
9	介福乡	850,000.00	850,000.00	850,000.00	-	5	5		
10	锦斗镇	1,255,000.00	1,255,000.00	1,670,321.10	150,000.00	9	9		
11	坑仔口镇	1,355,000.00	1,355,000.00	1,585,401.00	100,000.00	9	9		
12	蓬壶镇	2,467,500.00	2,467,500.00	2,923,226.00	653,576.00	20	18		2
13	石鼓镇	4,775,000.00	4,275,000.00	5,150,155.00	5,027.00	18	18		
14	苏坑镇	1,205,000.00	1,205,000.00	1,226,622.00	190,000.00	9	9		
15	桃城镇	3,930,000.00	2,980,000.00	2,447,049.80	1,070,825.20	16	15		1
16	外山乡	737,500.00	737,500.00	723,042.00	120,000.00	5	5		
17	吾峰镇	1,785,000.00	1,785,000.00	1,683,251.00	101,749.00	12	12		
18	五里街镇	1,645,000.00	1,645,000.00	1,827,953.00	-	13	13		
19	下洋镇	1,410,000.00	1,410,000.00	1,803,930.00	4,195.00	11	11		
20	仙夹镇	1,400,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	-	10	10		
21	一都镇	3,950,000.00	3,250,000.00	3,051,828.00	248,172.00	14	13		1
22	玉斗镇	2,707,500.00	1,207,500.00	1,292,658.00	-	10	9		1
总计		**49,062,500.00**	**42,742,500.00**	**85,013,490.15**	**5,088,455.62**	**281**	**270**	**3**	**8**
